

Instalaciones y Mantenimientos Eléctricos y Lumínicos Proyectos Eléctricos y Lumínicos Control de Tránsito

Uruguayana 3378 Tel.: 23062613 – 23058564 Email: <u>cchinstalaciones@yahoo.com</u> Montevideo – Uruguay





# PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

### **REFERENCIA**

# CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY

CONTRATO: I19 AMPLIACIÓN
Iluminación de dos empalme en la ciudad de Santa Lucía.
Ruta 11 y Ruta 63
Ruta 11 y Ruta 81

Elabora: Ing. M. Rodríguez

Revisa: Ing. E. Mino

Aprueba: Ing. L. Chapt

### 1. Índice

Objeto

**Alcance** 

Referencias

**Definiciones** 

Introducción

Planificación

Realización

**Documentos asociados** 

Anexo

#### 2. Objeto

Establecer la metodología por la cual CCH Instalaciones S.A. gestiona:

- sus programas de gestión ambiental asociado a la ejecución de obras.
- acciones programadas de respuesta para el caso de accidentes y/o emergencia.
- las comunicaciones de clientes y partes interesadas.

#### 3. Alcance

Tiene por alcance todas las actividades asociadas a la ejecución de instalaciones nuevas y mantenimiento de semáforos y destellantes.

#### 4. Referencias

- Norma ISO 14001 en su versión vigente.
- Norma ISO 9001 en su versión vigente.
- Pliego de Condiciones particulares para las obras de Iluminación, Semáforos y Destellantes en Rutas Nacionales", del Departamento de Seguridad den el Tránsito de la Dirección Nacional de Vialidad.

#### 5. Definiciones

SG: Sistema de Gestión según las normas ISO 9001 e ISO 14001 en sus versiones vigentes.

#### 6. Introducción

CCH Instalaciones S.A. fue fundada en el año 1998 y se dedica a proyectos, ejecución de obras y mantenimiento de iluminación, sistemas de control de tránsito y semáforos e instalaciones eléctricas y electrónicas, suministro de luminarias LED para alumbrado exterior y ópticas Led para semáforos.

CCH Instalaciones S.A. está registrada en el Registro Nacional de Empresas Públicas en Categoría I Arquitectura especialidades: A, B, C D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P y en Categoría II INGENIERIA, especialidades: E, G.

La empresa está registrada como Empresa de Eficiencia Energética ESCO en el Ministerio de Industria Minería y Energía MIIEM y como firma instaladora en UTE, Categoría A.

Cuenta con equipamiento y personal especializado en obra civil de alumbrado público, exterior y semáforos.

Su casa comercial sito en Uruguayana 3378, Montevideo.

CCH Instalaciones S.A. ha introducido al Uruguay conceptos modernos en iluminación vial y decorativa urbana, incorporando luminarias SCHREDER en el año 2001 al mercado cumpliendo con las más altas exigencias técnicas y evolución tecnológica. Las luminarias son de diseños modernos, de alto rendimiento, gran estanqueidad y durezas superiores a IP 65 en todos sus modelos.

Actualmente la empresa se encuentra abocada al uso de tecnología led de alto rendimiento, logrando de esta forma proyectos lumínicos de menor consumo de energía eléctrica respecto a las tecnologías convencionales y ampliando la vida útil de los insumos utilizados en la ejecución.

### 7. Planificación

# Política del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental.

#### MISIÓN

Nuestra misión es la de iluminar en forma eficiente las rutas, los espacios exteriores y las ciudades; así como la de participar activamente en el desarrollo de sistemas de control de tránsito seguros y

Proyectando, ejecutando, manteniendo y empleando productos de alta calidad, introduciendo las últimas innovaciones en estas áreas y colaborando estrechamente con los organismos públicos, concesionarios de obras públicas, privadas y empresas constructoras viales.


# POLÍTICA DE CALIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL

La Dirección de CCH INSTALACIONES S.A. considera de forma implícita los siguientes puntos como herramienta de gestión empresarial y con el fin de lograr cumplir con los objetivos planificados.

- Considerar los aspectos ambientales en las instalaciones y obras que se ejecuten, tomando como Para esto se compromete a: premisa el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y los requisitos legales que la empresa
- Aportar los recursos necesarios para implementar programas ambientales que tengan por fin la prevención de la contaminación manteniendo además el compromiso de proteger el medio ambiente en las actividades que se realicen, como por ejemplo minimizando la generación de residuos.
- Brindar alternativas innovadoras, de calidad y a un bajo costo, que cumplan las necesidades de clientes con el fin de lograr la satisfacción de los mismos.
- Promover y reforzar alianzas con proveedores como estrategia comercial.
- Contribuir al desarrollo profesional y humano de nuestros colaboradores como método para lograr la mejora continua de los procesos de la empresa y la mejora del desempeño ambiental.

Ing. Luc Chapt Marzo de 2017.

### o Organigrama

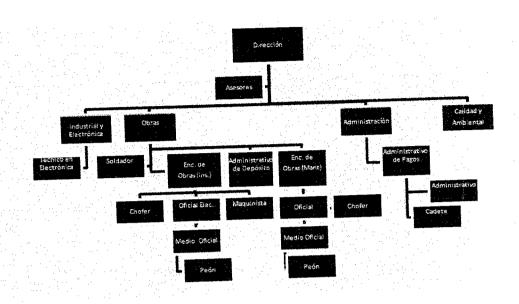

### Responsabilidades ambientales

De acuerdo al organigrama, la Dirección de CCH Instalaciones ha definido un Manual de Competencias Laborales donde se especifican las responsabilidades para cada puesto de trabajo, incluyendo las que afectan directamente a la gestión ambiental. El Manual antes mencionado forma parte de la información documentada mantenida por la empresa.

### 8. Realización

o Requisitos legales y otros requisitos.

La Dirección considera en la implantación, mantenimiento y desarrollo del Sistema de Gestión, la determinación y cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y los que la organización suscribe aplicables a sus actividades.

- La Dirección de la empresa define como aspectos ambientales significativos a los o Aspectos ambientales. siguientes y propone para cada uno la realización de controles y Programas Ambientales:
  - Residuos generados durante el mantenimiento preventivo de vehículos.
  - Derrames de combustibles.
  - Residuos generados durante la ejecución de la obra.

La comunicación al personal de obra de este punto se realiza a través de los documentos Manual del Sistema de Gestión, 109.02-01 Instalaciones nuevas, P.A.03.01 Gestión ambiental en actividades asociadas al mantenimiento preventivo y P.A.09.02-02 Gestión de residuos en Obras de Instalación, donde se explicitan las responsabilidades, controles y frecuencia para la realización de cada actividad.

### o <u>Programas ambientales</u>

Las actividades definidas para la mejora del desempeño ambiental de la empresa, se establecen en documentos denominados Programas Ambientales. En dichos documentos se especifican las tareas a realizar teniendo presente las siguientes premisas:

- jerarquía en la gestión residuos
- separación y clasificación
- valorización de residuos.

# Jerarquía en la gestión de residuos.


El siguiente gráfico representa en proporción como debe realizarse la gestión responsable de los residuos, aplicando como política general la reducción en origen.



# Separación y clasificación de residuos:

Por Decreto Nº182-13, los residuos generados por empresas deben ser gestionados fuera del circuito de recolección habitual.

CCH ha implementado un procedimiento de recupero y recolección de residuos con la intención de realizar su posterior valorización. Esto incluye el compromiso de todo el personal en la ejecución de una adecuada clasificación y separación de acuerdo al origen del residuo y según el siguiente esquema.

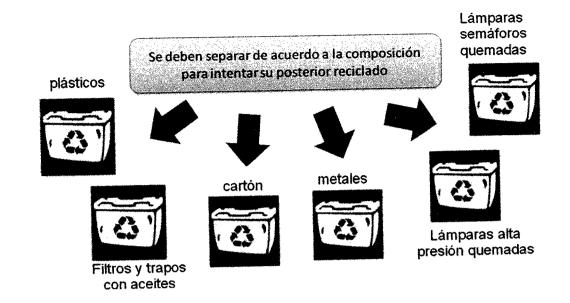



### Valorización de residuos:

Una vez separado y clasificado cada residuo, se pasa a una etapa posterior de valorización del mismo como ser: reutilización, reciclado ó venta a operador.

#### Rubros:

Plásticos, metales, papel y cartón: se intenta su reutilización. De lo contrario se realiza la venta a operador.

Lámparas, trapos, aceites, aserrín y/o arena contaminada con aceites: entrega a empresa recolectora autorizada.

Neumáticos: se realiza el recauchutaje. En caso de no ser posible, se entrega a empresa que procesa el residuo para su disposición final.

Otros plásticos que no puedan ser vendidos se entregan en Vertedero Municipal bajo permiso previamente tramitado.

Bobinas de cables: son devueltas al proveedor quien posteriormente las reutiliza.

# o Planes de contingencia para el caso de accidentes.

La empresa cuenta con un procedimiento de Preparación y respuesta ante emergencias según su Manual de Gestión para identificar el potencial de respuesta ante accidentes y situaciones ambientales de emergencia, con el fin de prevenir y atenuar los posibles impactos ambientales negativos asociados a los mismos.

Para esto anualmente se realiza un análisis a través del estudio de los procesos operativos de la empresa, con el objetivo de realizar un reconocimiento temprano de las posibles fallas y una estimación adecuada de riesgos.

En el siguiente cuadro se describe de forma simplificada la operativa antes mencionada y las acciones que forman parte del resultado del análisis de riesgos.

<u> İtem</u>	Resultado	
Procesos operativos de obra.	Se realiza la descripción en etapas de cada uno de los procesos que conforman la obra.	
Análisis de Riesgos.	Para cada uno de los procesos en estudio, se analizan las posibles fallas y los riesgos asociados las mismas, ya sean desde el punto de vista ambiental, de seguridad del personal y/o de terceros.	
Planes de Acción.	Del resultado del análisis de riesgos se definen acciones de mejora con el fin de disminuir la posibilidad de aparición de la falla y de mitigar sus impactos en caso de ocurrencia.  Los Planes de Acción pueden contemplar:  - la capacitación del personal  - adecuación de los procesos existentes  - inversión en la incorporación de nuevas tecnologías y/o infraestructura.  - implementación de actividades de contingencia.	
Planificación y revisión de las actividades de contingencia.	Se prevén planes de respuesta en caso de accidentes los cuales son revisados periódicamente con el fin de verificar su adecuación y eficiencia.	

Del resultado de la aplicación del procedimiento mencionado se elaboran instructivos con el fin de prevenir accidentes y determinar las acciones para minimizar las consecuencias en caso de que ocurriesen.

- Para la acción en caso de incendios se establece el instructivo 103.01 Rutina General en Caso de Incendios.

- Para minimizar los riesgos de accidente en obra se define el 109.02-02 Seguridad en vía pública.

Para la acción ante un accidente de tránsito es elabora el I 09.01-03 Accidente de tránsito, donde se explicita el modo de respuesta para brindar los primeros auxilios necesarios al personal afectado.

# o <u>Comunicación externa de partes interesadas.</u>

La comunicación externa que ingresa a la empresa vinculada a temas ambientales o de calidad, es entregada a la Dirección de Obras o a la Dirección. Esta comunicación puede estar asociada a reclamos, quejas, sugerencias.

De acuerdo al siguiente cuadro, posteriormente se analiza esta comunicación y son ellos los responsables de canalizar la repuesta (si corresponde), darle seguimiento mediante el SG y posterior archivo si corresponde.

Responsable por de gestionar y dar respuesta si corresponde.	Responsable por dar respuesta formal (si corresponde)
Administración	Director de Obra/Dirección
	Director de Obra
Administración	Dirección
Administración	Director de Obra
	gestionar y dar respuesta si corresponde.  Administración Administración Administración

En el Manual de Gestión se describe con mayor detalle la operativa antes mencionada.

Los contactos para CCH INSTALACIONES S.A. son los siguientes.

- Teléfono fijo: (598) 2306 26 13

Celular: (598) 99 395 920

Correo: cchinstalaciones@yahoo.com

o Personal de la empresa CCH Instalaciones S.A. realiza sus procesos centrales en un 100% con personal efectivo.

# 9. Documentos asociados — (ANEXO).

- I09.01-03 Accidente de tránsito
- I03.01 Rutina General en Caso de Incendios.
- 109.02-02 Seguridad en vía pública.
- I09.02-01 Instalación de Obra Nueva.
- P.A.03.01 Gestión ambiental en actividades asociadas al mantenimiento preventivo.
- P.A. 09.02-02 Gestión de residuos en Obras de Instalación

#### ANEXO.

## INSTRUCTIVO: ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Código: 1 09.01-03
y aprobado por: Ing. Luc Chapt
-

Modificaciones respecto a la edición anterior: Revisión y actualización.

OBJETIVO: Describir un procedimiento de acción ante un accidente de tránsito.

#### **OPERATIVA:**

- Intentar señalizar el lugar del accidente con el fin de dar aviso a terceros que pasen por el sitio y evitar así otras colisiones. Si es de noche colocar balizas e iluminar la zona del accidente.
- Verificar si existen accidentados graves para explicar a las autoridades la magnitud del accidente.
- 3) Llamar al 911 detallando con la mayor tranquilidad posible la ubicación del siniestro.
- 4) NO MOVER a los heridos ya que se esto podría empeorar la situación. Esta regla tiene dos excepciones, cuando el vehículo corre peligro de incendio o cuando puede caer al aqua. Realizar la tarea con sumo cuidado sin tirar del cuerpo del herido y si es posible con la colaboración de 3 personas más.
- 5) En el caso de motociclistas, nunca se debe retirar el casco.
- Una vez que el auxilio arribe al lugar, NO obstruir las tareas que realicen los rescatistas y colaborar aportando la información que ellos soliciten.
- 7) Comunicarse con personal de la empresa para poner al tanto de lo ocurrido.

### Teléfonos de emergencia:

# CENTRO AUXILIAR DE SANTA LUCÍA

Tel: 43346002

# POLICIA CAMINERA 108

## EMERGENCIA 911

# <u>INSTRUCTIVO</u>: ATENCIÓN DE INCENDIO EN OBRA.

	Instructivo de trabajo
CCH INSTALACIONES S.A.	
	Código. 1 03.08
Título: Atención de incendios en obra.	Canan 4 do 3
N° edición: 01 Fecha: 10/03/201	- Locatedado y aprobado por ino i us Chapt
N° edición: 01   Fecha: 10/03/20   Elaborado por: Ing. Edgardo Mino; Ing. Marcelo Rodrig	ruez i Communado y aprobado por mis

### Modificaciones respecto a la edición anterior:

**OBJETIVO:** Describir la manera de actuar del personal de la empresa, ante la aparición de un foco de incendios en oficina central.

Manejo de residuos posteriores.

#### **OPERATIVA:**

- El operario que detecte un foco de incendio en obra, debe dar inmediato aviso al personal que se encuentre en los alrededores con el fin de alertar a la mayor cantidad posible de personas y con el fin de evacuar a la brevedad el lugar de trabajo.
- Con la utilización del extintor ubicado dentro de los vehículos, debe intentar realizarse
   la primera extinción del fuego.
- Alejar de las cercanías del foco de incendio tanto vehículos, bidones de combustible u otro material que pueda avivar al fuego.
- De no ser posible la extinción del fuego, alejarse la mayor distancia posible del foco de incendio y dar aviso a Bomberos y al 911.
- Impedir que terceros se acerquen al sitio donde se genera el incendio por ejemplo balizando el sitio para desviar el tránsito.

TELEFONO BOMBEROS: 104 EMERGENCIA: 911

### INSTRUCTIVO: SEGURIDAD EN LA VÍA PÚBLICA.

EZ CCH INSTALACION	}	instructivo de trabajo	
Título: Seguridad en vía pública	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	Código:	1 09.02-62
Nº edición ú1	Techa: 19/02/2011		Página 1 de 1
Elaborado por: Ing. Edgardo Mino	Contro	olado y aprobado por. Ing. l	Luc Chapt

Modificaciones respecto a la edición anterior:

OBJETIVO: Establecer las pautas básicas de seguridad para todo personal de la empresa que realice trabajos en la vía pública.

#### **OPERATIVA:**

- Se debe usar en todo momento chaleco con vivos reflectivos.
- Se debe utilizar implementos de seguridad tales como:
  - zapatos de seguridad
  - casco
  - guantes
  - lentes
- Para los trabajos con tensión las herramientas deben ser aisladas.
- Para la ejecución de trabajos en altura debe utilizarse arnés de seguridad.
- En el lugar de trabajo debe encontrarse un botiquin de primeros auxilios

### ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN EN LA VIA PUBLICA

- En la construcción de obras nuevas con presencia de personal todos los días, se debe instalar señalización fija color naranja indicando a los conductores la proximidad de obras en ejecución y de reducción de la velocidad de circulación.
- En los lugares especificos de trabajo se debe delimitir la zona con circulación restringida mediante señalización móvil y elementos de balizamiento (balizas o conos delineadores de PVC).

### <u>INSTRUCTIVO: INSTALACIÓN DE OBRA NUEVA.</u>

CCH INSTALACION	Į	uctivo de trabajo	seed of Landson Chief on Manager Conde
Título: Instructivo de instalacione	ll	Código: 1 09.02-01	
N° edición, 03	Fecha: 11:03/2017	Página 1 de	= 1
Elaborado por Ing. Edgardo Mino	Controlado y	aprobado por: Ing. Luc Chapt	

Modificaciones respecto a la edición anterior: Se incluye la operativa para la instalación de columnas metálicas.

OBJETIVO: Describir un instructivo de trabajo para la realización de obra nueva de alumbrado.

### EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:



### RIESGOS ASOCIADOS A LA TAREA

CATEGORIA DE RIESGO	CAUSA	MÉTODO DE MITIGACIÓN
ALTO	Accidente de tránsito.	Señalización del sitio de trabajo con conos reflectivos.
ALTO	Caída desde altura.	Utilización de amés de seguridad amarrado a un punto fijo del brazo de grúa.

#### **OPERATIVA:**

Como definiciones previas se aplican las siguientes:

DO: Director de Obra EO: Encargado de Obra.

Flores	Actividad.	Tareas y Controles	Responsable	
Etapa Planificación particular de la obra	-	Trámites ante organismos públicos, solicitando información de tendidos existentes y permisos necesarios para la remoción de pavimentos.	Director de Obra	Formularios de solicitud de información en el formato que corresponda.
Suministro	Compra	Solicitar información técnica al proveedor previo a la compra. Si es posible, realizar inspección en Planta del Proveedor para verificar: Columnas de hormigón:	D.O.	

Etapa	Actividad,	Tareas y Controles	Responsable	Registros.
	Recepción	Controlar dimensiones y tipo de columna.	E.O.	Remitos.
Instalación de columnas (de hormigón y metálicas).	Cateos.	Cateos verificando la información suministrada.	E.O.	Información suministrada por organismos.
	Excavación.	Realizar la misma de acuerdo a planos del proyecto: ubicación, ø, profundidad, dimensiones del macizo.	E.O.	Resumen obra nueva
	Ejecución de la fundación con molde	Elaboración del hormigón para fundación: Los componentes se deben mezclar en hormigonera de 1 bolsa.  - Dosificación 3:2:1. Se debe trabajar con herramientas adecuadas, para darles la terminación prevista en planos. Se debe llenar en una sola etapa. Si por alguna razón no se pudiera realizar, se seguirás las instrucciones de la D.O.  Fundación para columnas de hormigón pretensado: Se instala ducto de ø63 y codo PVC para posterior enhebrado de cable. Colocación de hormigón definido por la D.O. en el fondo de la excavación de acuerdo a proyecto. Se verifica espesor y se compacta el hormigón. Una vez que comienza el proceso endurecimiento del hormigón se instala el molde, se centra, se aploma y se procede al vertido del resto del hormigón de la fundación. Cuando lo permita el fraguado del hormigón se procede al retiro del molde, se coloca una tapa de chapa y por encima de ésta, suelo de la excavación.  Fundación para columnas metálicas: Se instala ducto de ø63 y codo PVC para posterior enhebrado de cable.  Se llena la excavación con el hormigón de fundación, en toda su profundidad. En caso de ser terreno arenoso o con presencia de napa, se utiliza encofrado. Luego del llenado, se instala armadura en espera utilizando el método de vibrado. Inmediatamente post llenado, se coloca platina (plantilla) para		Resumen obra nueva.
		corregir la ubicación de las armaduras. Se deja fraguar el H° de la fundación mínimo 3 días.		

	A-45-14-4	Tareas y Costrolos	Responsable	Registros.
Etapa Instalación de	Actividad. Colocación de	Tareas y Controles Previo a su colocación se enhebra	E.O.	Resumen obra
columnas (de hormigón y metálicas).	columna.	dentro de la columna los conductores de acometida y puesta a tierra desde la cima hasta el registro donde se instalará la caja de conexión.		nueva.
		En columnas de hormigón pretensado: Control del centrado, aplomado y acuñado con arena saturada en agua. Colocación del collarín de arena y portland. Finalmente se realiza un fuste (de acuerdo a la base de la columna) con hormigón para proteger la zona de anclaje de la columna.		
		En columnas metálicas: Regular verticalidad ajustando las tuercas inferiores. Luego se afirma la base mediante arandelas y tuercas. Finalmente se realiza un fuste (de acuerdo a la base de la columna) con hormigón para proteger la zona de anclaje de la columna.		
Brazos de luminarias.	Suministro.	Controlar especificaciones técnicas de acuerdo a pliego, previo a la compra.	D.O.	Orden de Compra.
	Instalación.	Verificar que el producto haya pasado por el control previo del cliente. Enhebrar los brazos con los conductores de acometida y puesta a tierra previamente instalados en las columnas Controlar que todos los elementos de fijación sean colocados de manera adecuada.	E.O.	Resumen obra nueva.
Suministro e instalación de luminarias.	Suministro.	Controlar especificaciones técnicas de acuerdo a pliego, previo a la compra. Verificación en taller de CCH Instalaciones S.A. de correcto funcionamiento de lámpara y equipo eléctrico.	D.O.	Remito
	Instalación de luminarias.	Control en la colocación de todos los elementos de sujeción. Control de la nivelación de las luminarias. Conectar conductor de alimentación y de puesta tierra en la luminaria	E.O.	Resumen obra nueva.

Etapa	Actividad.	Tareas y Controles	Responsable	Registros.
Suministro de conductores eléctricos	Suministro.	Controlar junto con el cliente la verificación de los ensayos necesarios para aprobación de los conductores eléctricos. Controlar cantidades y especificaciones.	D.O.	Orden de Compra
Zanjeo y tendido de conductores eléctricos	Retiro de material.	Extracción de material según el trazado definido y la profundidad requerida. Acopio del material al costado de la zanja	E.O.	Resumen obra nueva.
	Ejecución de túneles	Cateos previos a la ejecución. Verificar nuevamente servicios existentes previo a la realización de pozos y tuneleo.	E.O.	Resumen obra nueva.
Zanjeo y tendido de conductores	Instalación de conductores	Colocar arena sucia en el fondo de la excavación.  Tender los conductores de acuerdo a proyecto eléctrico, cuidando de no dañar la aislación ni quebrar el cable.  Insertar en el registro inferior de la columna y protegidos por ducto de poliestileno los conductores de alimentación de la luminaria y puesta a tierra y enhebrarlos dentro de la columna hasta el registro de ubicación de la caja de conexión.  Frente a la columna y dentro de la zanja, hincar jabalina de puesta a tierra tipo Copperweld y conectar conductor de puesta a tierra.  Colocar arena sucia encima de los conductores tendidos en el espesor de indicado en el pliego.  Colocar sobre la arena cinta de PVC impresa con nombre del cliente e información del material instalado.	E.O.	Resumen obra nueva.
	Relleno y compactación	Rellenar la zanja con suelo de la excavación, compactar manual y mecánicamente y tender material sobrante.	E.O.	Resumen obra nueva.

Etapa	Actividad.	Tareas y Controles	Responsable	Registros.
Suministro e instalación de cajas de conexión con interruptor termomagnético	Suministro	Verificación de que las piezas de aluminio coincidan con lo solicitado Preparación en taller de CCH de las especificaciones respecto a pintura, cierres y colocación de riel DIN para instalación de interruptor termomagnético.  Controlar compra de interruptores termomagnéticos homologados.	D.O.	Orden de Compra.
	Instalación de cajas de conexión	Amurar sobre el registro de la columna caja de conexión previo al siliconado de la cara de apoyo.  Instalar interruptor termomagnético y realizar conexionado de conductores.	E.O.	Resumen obra nueva
Pilastras y tableros	Ejecución	Realizar pilastra de mampostería para alojamiento de tablero eléctrico y cajón de medidores de energía de acuerdo a dimensiones de tablero y acotaciones de pliego.	E.O.	Resumen obra nueva
Tablero de protección y control	Suministro	Control de las especificaciones del tablero metálico en cuanto en medidas, ajuste de puerta, frente muerto, cerrojos.	D.O.	Orden de Compra
	Suministro	Instalación de elementos eléctricos y conexionado de los mismos de acuerdo a planos unifilares.	D.O.	Remito
	Instalación	Amure de tablero metálico en la pilastra, conexionado a conductores de líneas de iluminación y conexionado a alimentación de UTE.	E.O.	Resumen obra nueva.
Numeración de columnas	Pintura de número	Identificación de cada columna mediante número indicado en plano de obra.	E.O.	Resumen obra nueva.
Construcción de fustes	Ejecución	Sobre la fundación y alrededor de cada columna se construirá en hormigón un fuste de 0,40m x0,40m x 0,10 m	E.O.	Resumen obra nueva.
Aprobación de la obra.	Pruebas y ensayos.	Control de mediciones eléctricas de acuerdo al pliego de condiciones.	D.O.	Planilla de mediciones eléctricas

### PROGRAMAS AMBIENTALES:

### P.A. 09.02-02 GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRAS DE INSTALACIÓN

CCH INSTALACIONES S.A.	Programa Ambiental:  GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRAS DE INSTALACIÓN
Fecha: 30/04/2017 E	dición: 01   Código: <b>P.A. 09.02-02</b>   Página 1 de 3
Elabora: Ing. Edgardo Mino, Ing. Marcelo Rodríguez	Revisa y aprueba: Ing. Luc Chapt

, bi	BJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES	ÓN
	N DE RESIDUOS EN OBRAS DE INSTALACI	ON.
	Objetivo:	
Responsabilidades compartidas entre la Dirección de Obras, Administrativo de Depósito y Responsable del Sistema de Gestión (SG).	Mejorar la gestión de residuos en Obras de Instalación.	
Indicadores:	Netas	Registro:
Estado de la limpieza de Obrador y zona de ejecución de obra.	1.1 Que no existan residuos disperdigados fuera de los sitios definidos ó recipientes.     1.2 Disposición final realizada conforme al Programa Ambiental.	Hoja de Datos.

PROCESO

Actividades del proceso	Controles requeridos	Responsable	Registro
Activodoca dei proceso	RESIDUOS ASIMILABLES A INDUSTRIALES		
SOBRANTES Y RESTOS DE OBRA (CONSUMBL			
Restos de cables.	Finalizada la obra controlar que sean entregados en predio central de la empresa. Separación de componentes (plástico y metal) para su posterior reutilización.	Encargado de Obra/Administrati- xo, de Depósito.	Hoja de Datos.  Facturas (operador, reciclador).
Bobinas de cable.	Finalizada la obra, se entregan al proveedor para su reutilización.	Encargado de Obra/Administrativ o de Depósito.	Hoja de Datos.
Trapos secos, nylon (protección de columnas metálicas).	Controlar que sean acopiados en Obrador. Si es posible se reutilizan como trapos para limpieza y posteriormente se gestionan como residuo industrial. Controlar que este residuo no quede dispertigado. Entrega en Vertedero Municipal.	Encargado de Obra.	Remito de entrega.
Tanques ó depósitos vacios conteniendo restos de sólidos o líquidos de algunos de los siguientes elementos: - Lubricantes - Combustibles - Pinturas	Controlar que sean entregados en predio central de la empresa. Posteriormente se gestiona su disposición final como residuos asimilables a industriales.	Encargado de Obra. Administrativo de Obra. Responsable del	Hoja de Datos.  Formulario IM –
Trapos sucios. Filtros. Mangones Correas.		SG.	Faro Punta Carretas

CCH INSTALACIONES S.A.	Programa Ambiental: GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRAS DE INSTALACIÓN
	Idón: 01   Código: P.A. 09.02-02   Página 3 de 3
Elapora: Ing. Edoardo Mino, Ing. Marcelo Rodriguez	Revisa v aprudia: Ing. Luc Chapt

Actividades del proceso	Controles requendos	Responsable	Registro
	RESIDUOS ASIMILABLES A INDUSTRIALES	,	, vergerer
SOBRANTES Y RESTOS DE OBRA (CONSU	MIBLES)	A MERCANIA DESCRIPTION	F. S. S. S. S. S. S. S. C.
Otros residuos.	En caso de existir dudas sobre la disposición final se debe consultar la Hoja de Seguridad del producto.	Director de Obra.	Hoja de Datos.
		Responsable del SG.	
INSUMOSNO CONFORMES			esta de la composición dela comp
Lámparas defectuosas Luminaria defectuosa Equipos averiados Otros	Controlar que sean entregados en predio central de la empresa una vez finalizada la obra. Si el insumo está en garantía se reclama al proveedor. De lo contrario se dispone como residuos industriales.	Encargado de Obra/D.O.	Seguimiento de desviaciones. Hoja de Datos.
	RESIDUOS ASIMILABLES A DOMICILIARIOS	1	<u> </u>
Residuos generados a partir de alimentos consumidos por personal de Obra.	Son depositados en contenedor dispuestos por el município de la zona.	Encargado de Obra.	No aplica

# P.A. 03.01 - GESTIÓN AMBIENTAL EN ACTIVIDADES ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

CCH INSTALACIONES S.A.	Programa Ambiental: GESTIÓN AMBIENTAL EN ACTIVIDADES ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.		
Fecha: 20/03/2016 Ed	lición: 01 Cádigo: P.A. 03.01	Página 1 de 2	
Elabora: Ing. Edgardo Mino, Ing. Marcelo Rodriguez	j Revisa y aprueba: Ing. ()	με Chaoτ	

Responsable:	N ACTIVIDADES ASOCIADAS AL MANTENII Objethes	
Responsable del Sistema Integrado.	Adecuar la gestión de los residuos generados en las instancias de que sea más eficiente y acorde a las necesidades actuales de la e	
Indicadores:	Metas	Registros:
Comunicar a los involucrados la necesidad de mejorar la eficiencia en los procesos	1. Eficacia de la comunicación comprobada	Plan de capacitación, Listas de asistencia, Evaluación de la eficacia de la capacitación
Derrames de aceite (se miden tanto en obras como dentro de las instalacione		Seguirniento de desviaciones.
de CCH).		<b>\$</b>

	PROCESO	1.45	
Actividades del proceso	Controles requeridos	Responsable	Registro
Cambios de aceite y filtros.		190 0 6 6 32 Tall 1977	
En obça, realizar las actividades de mantenimiento controlando posibles derrames.	Aplicar lo establecido en el instructivo 103.03 "Mantenimiento de maquinaria en obra". Trasladar aceite guernado y filtros usados al depósito central		Ficha de mantenimiento del equipo/Check list de
	en Montevideo.		equipos y vehículos.

Actividades del proceso	Controles requeridos	Responsable	Registro
Mantenimiento en Estadón de Servido.	Solicitar los residuos generados en la Estación (aceite y filtros). Disponer en sitio definido en las instalaciones de CCH (depósito central en Montevideo).	Chofer	Ficha de mantenimiento del equipo.
Cambios de aceite y filtros.			
Coordinar disposición final de residuos.	Aceite quemado: recolección por Operador autorizado. Filtros y asimilables a industriales: gestionar entrega en Vertedero Municipal.	Responsable del SGI.	Remitos, Permisos gestionado ante IMM, Hoja de Datos xis
Raterias			
Realizar la entrega al proveedor de las baterías usadas.	Solicitar remito al momento de compra y entrega batería usada.	Chofer/ Responsable del SGI.	Remito entregado por el proveedor.
Hermálicos usados.			
Acopio de neumáticos usados en depósito central de CCH.	Acopio en sitio cerrado.	Responsable del SGI.	No aplica
Recauchutaje (si es posible) o entrega a proveedor autorizado.	Coordinar con Operador autorizado la disposición final.	Responsable del SGI.	Remito de entrega
