



LICITACIÓN C /67 - C/68

Sr. Director de Obra
Dirección Nacional de Vialidad
Ing. Jorge Mures
Presente:

Ref.: Obra "Ruta No. 20, Tramo: Ruta 3 – 96k500"

Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Por la presente elevamos a Ud. *ITGA* elaborado para la obra de referencia, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2017.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.




Ing. Horacio Mársico
Técnico Residente

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

1. Campamento

Plano del campamento.

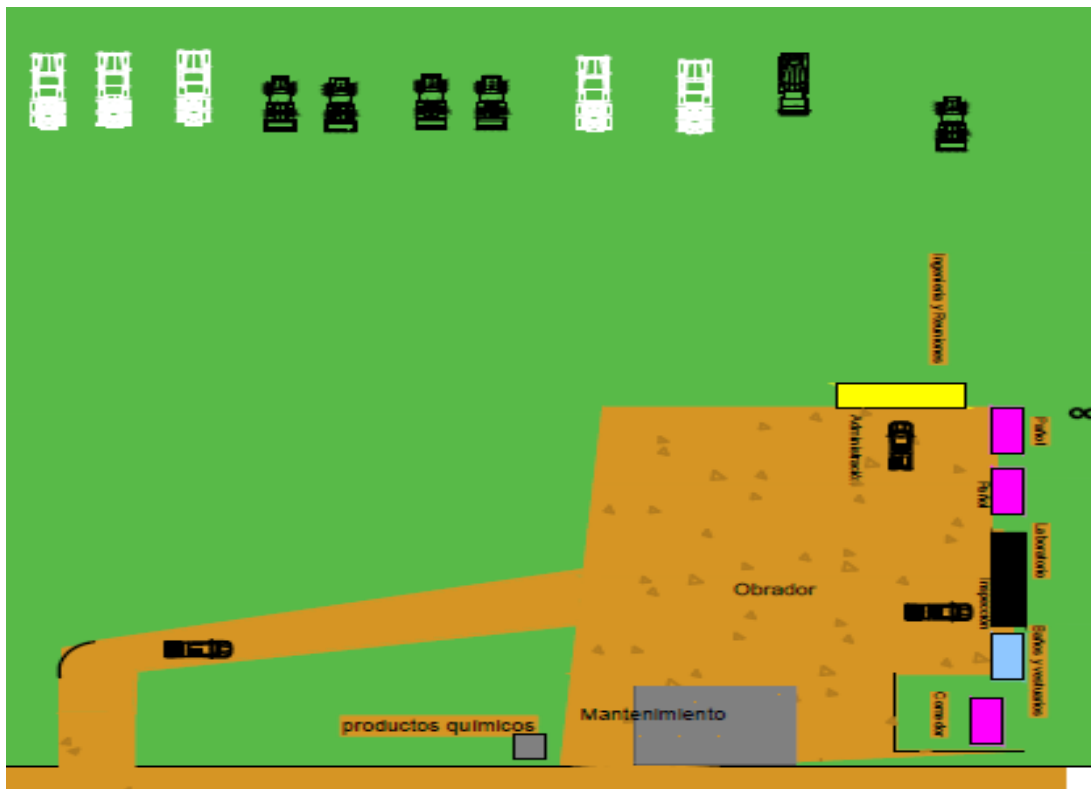

Croquis del campamento con los distintos elementos que lo integran, actualizado a abril de 2017

En el referido trimestre, el campamento contó una batería de baños fijos.



LICITACIÓN C /67 - C /68

Otros tres baños químicos se ubicaron , uno en la cantera y los otros dos en los frentes de obra.

No se han hecho limpiezas del pozo negro del campamento, debido a que no ha sido necesario hasta el momento.

No se han cambiado los depósitos de los baños químicos.

El agua para consumo humano es de tipo comercial, distribuida en bidones. En el campamento se cuenta con dos dispensadores. En los frentes de obra el personal cuenta con recipientes térmicos adecuados.

El campamento mencionado se ubica próximo a la ruta 3 en la entrada de Ruta 20 hacia Grecco localidad del departamento de Río Negro, en el padrón N° 6912, 7a sección catastral de Río Negro, con frente en el km 77k500 de la Ruta Nacional N° 20, objeto de la obra.



obrador



LICITACIÓN C /67 - C /68

2. Residuos sólidos domésticos

Los puntos de generación y recolección de residuos son de tipo transitorios, ubicándose junto al pañol los tachos para los distintos tipos de residuos en el obrador.

Una vez colmada la capacidad de los tachos de residuos, éstos se transportan al vertedero municipal de Young, lo que en el periodo de trabajo desde el inicio de las obras corresponden a la planilla adjunta.

Otros puntos de generación de residuos domésticos, en canteras contiguas al obrador se centralizan en este último.

Retiro de residuos sólidos comunes								
Cantidad retirada								
Fecha	Empresa	Lugar	organicos	plastico	papel	Disposición final	Responsable	Observaciones
10-Mar-	Meliter	obrador	200 lts	200 lts	200 lts	Young	Ottonelli	boleta firmada por oficina Young
5-Abr-17	Meliter	obrador	200 lts	300 lts	300 lts	Young	Ottonelli	boleta firmada por oficina Young

3. Residuos especiales

Los residuos especiales se generaron básicamente en los mantenimientos de equipos. Estos se realizan por empresa contratada (Petersen) los que gestionan sus propios residuos especiales

Aquellos residuos que no surgen de los mantenimientos se gestionan con envíos al depósito de Montevideo desde donde se derivan a los depósitos de disposición autorizados.

Se resume en la planilla que sigue, aquellos residuos especiales gestionados desde la obra.



Retiro de residuos especiales

Fecha	Empresa	Lugar	Tipo de residuos	Cantidad retirada	Disposición final	Responsable	Observaciones
17-Mar-17	Meliter	obrador	cubiertas	1	Deposito Mdeo	Ottonelli	
17-Mar-17	Meliter	obrador	latas vacías	4	Deposito Mdeo	Ottonelli	
17-Mar-17	Meliter	obrador	baterías	1	Deposito Mdeo	Ottonelli	
17-Mar-17	Meliter	obrador	puntas gastadas	4	Deposito Mdeo	Ottonelli	

4. Mantenimiento y lavado de maquinaria

No se realizan lavados de maquinaria. El mantenimiento está tercerizado y se construirá una losa con contención para aquellas emergencias de mantenimiento o minireparaciones.

5. Canteras

La obra requiere el uso de agregados pétreos de trituración y de agregados pétreos naturales.

En el presente período se realizó extracción de material granular natural, de la cantera ubicada en el km. 77 de la Ruta 20 incluida en el Inventario de Canteras de Obra Pública correspondiente.



LICITACIÓN C /67 - C /68



6. Personal

Al final del período de referencia, el personal que de una u otra forma participa directamente de la obra consiste en: 19 funcionarios de la empresa , en general maquinistas ; 14 funcionarios tomados en la zona, en general en trabajos de medio oficial.

7. Trabajos en la ruta

Hasta la fecha se han realizado trabajos de ensanche de firme, el que se ha hecho manteniendo y controlando el tránsito con personal capacitado especialmente.

LICITACIÓN C /67 - C /68

