MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS

MESA DE ENTRADA
26 SET. 2017
NUMERO DE REFERENCIA
2017-10-3-0003629
FIRMA

Formulario N° **2017-10-3-0003629**

Tipo de Formulario: Formulario

Tipo	PERSONA JURÍDICA
Nombre Titular:	Impacto construcciones S.A.
Domicilio Constituido:	Carlos M.Ramirez 679(trinida-flores)
Teléfono:	43648259
Email:	oficinatecnica@impactoconstrucciones.com.uy
Oficina Origen:	Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403
Asunto:	IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A. - ING.LUIS RODRÍGUEZ RIESGO RTE.INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL LUEGO DE SU ACEPTACIÓN´N PARA SER ARCHIVADO.¨LICITACIÓN Nº C/72 RUTA 45-TRAMO69K400-84K500¨ ¨LICITACIÓN Nº C/76 ¨RUTA 45-TRAMO54K400-69K400¨

Fecha Inicio:	**19/09/2017 10:00:51**	Fecha Valor:	**19/09/2017**
Prioridad:	**Normal**	Acceso restringido:	**No**
Elemento Físico:	**No**	Clasificación:	**Público**

REPÚBLICA
ORIENTAL
DEL URUGUAY

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Montevideo, 18 de setiembre del 2017

Sr. Jefe del Dpto. de Contratación de Obras Nacionales
Ing. Ernesto Carballo
Presente

Obra: *"Licitación N° C/72: "Ruta 45 – tramo 69Km400 – 84Km500"*
N° C/76: "Ruta 45 – tramo 54Km400 – 69Km400"

Asunto: Informe Trimestral de Gestión Ambiental.

De mi mayor consideración:

Se eleva el *Informe Trimestral de Gestión Ambiental* presentado por la empresa contratista *Impacto Construcciones S.A.* luego de su aceptación, para ser archivado.

Sin otro particular saluda atentamente.

Ing. Luis Rodríguez Riesgo

M. T. O. P.
D. NAL. V.
DEP. ADM. DOCUMENTAL
18 SEP 2017
FECHA DE ENTRADA

1/32

IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A.	**PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL**	**ITGA 1** **Página 1 de 17**

Periodo: Mayo 2017 a Julio 2017

El presente informe tiene como objetivo resumir las tareas realizadas en la Obra de Licitación C/72- "Rehabilitación Ruta 45, Tramo 69 Km 400-84 Km. 500" y LICITACION C/76- "Rehabilitación Ruta 45, Tramo 54 Km 400-69 Km. 400", teniendo en cuenta los indicadores de gestión ambiental, las fichas de control incluidas en el PGA presentado y las contingencias ocurridas.

1- Tareas realizadas

Durante el período antes mencionado se realizaron las siguientes tareas:

- ✓ Limpieza de faja y profundización de cuneta, incluyendo corrección de drenajes construcción de cabezales de alcantarilla.
- ✓ Retiro de señalización existente.
- ✓ Recargo para ensanche (ejecución de diente de banquina)
- ✓ Escarificado, conformado y compactado de pavimento existente, incluyendo bacheo de material granular.
- ✓ Recargo de base granular en pavimento y banquinas.

2- Evolución de indicadores de gestión ambiental

Se presenta planilla con indicadores de gestión ambiental.
En la misma se presenta un resumen de los residuos de obra, utilización de recursos naturales, datos correspondientes a seguridad y salud ocupacional y relacionamiento con la comunidad.

Puntualmente, en el mes de junio ocurrió una afectación a la UTE, ver Anexo1.

3- Obradores

Los obradores de la empresa se encuentran por el "Camino de la Costa" a 4kms del empalme con ruta 45.

Está compuesto por una oficina para la Empresa y uno para la Dirección de Obra. Un Laboratorio para ensayos de suelos y un Pañol (Herramienta y Depósito de Químicos).

Cuenta con dos baños químicos que se limpian con periodicidad, contratado a la empresa AYC químicos.

Plano Ubicación Oficinas

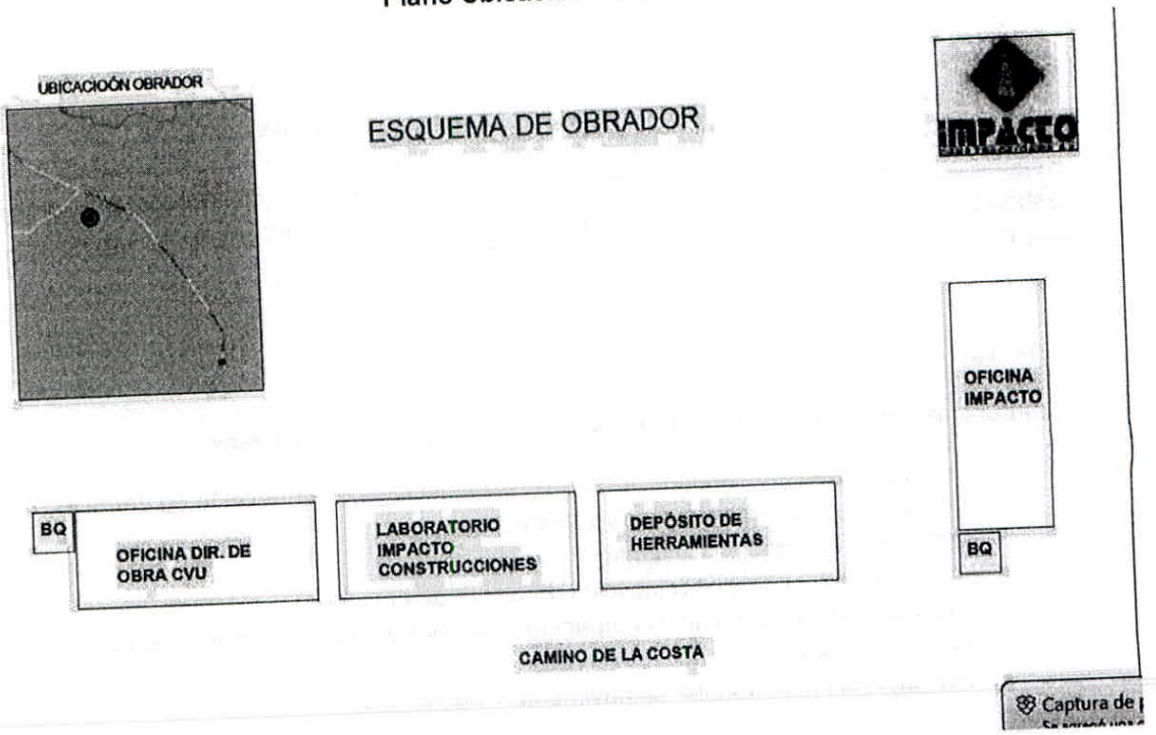

4- Residuos

4.1 Residuos Domésticos

Los residuos domésticos de los obradores así como de los frentes de obra se llevan al obrador y se clasifican en sus respectiva tarrina con bolsas. Los martes de cada semana. Se lleva un registro de cuanta basura doméstica se lleva en la "Planilla de Índices de Ruta N° 45". ANEXO I

4.2 Residuos para Clasificar (Papel, Cartón, Plástico)

Se han juntado, pero no se ha llegado a juntar un volumen considerable como para llevar para reciclar.

4.3 Residuos de hidrocarburos tierra contaminada

No se han registrado aun, en los cambios de aceites o mantenimiento de la flota, se usan bandejas y paños, los cual son llevados a taller de impacto para su posterior entrega a un clasificador, PETROMOVIL.

5- Mantenimiento de Maquinaria

En el campamento u zona de obra se realizan los mantenimientos ordinarios de las maquinas, cambios de aceites, filtros, etc; se realiza también alguna reparación que no necesite por sus características ingresar a Taller.
Para este tipo de trabajos hay un Mecánico con vehículo acondicionado con todas las herramientas para realizar ese tipo de mantenimiento o reparación, cuentan con quit anti-derrames (bandejas, paños, guantes, etc.). Anexo II Mantenimientos

6.- Cantera

La ubicación de la cantera es en el Departamento de San Jose, Paraje La Pachina, padrón rural N°2802. Las coordenadas son longitud- 56.750527; latitud -34.27745.

El material granular extraído de esta es para la realización y ejecución de los contratos C72 y C76 de la Corporación Vial del Uruguay.

Se accede al predio desde Ruta Nacional N°3 por camino Polimero, y dista a 6 km de la ciudad de San José de Mayo.

Plano de Ubicación

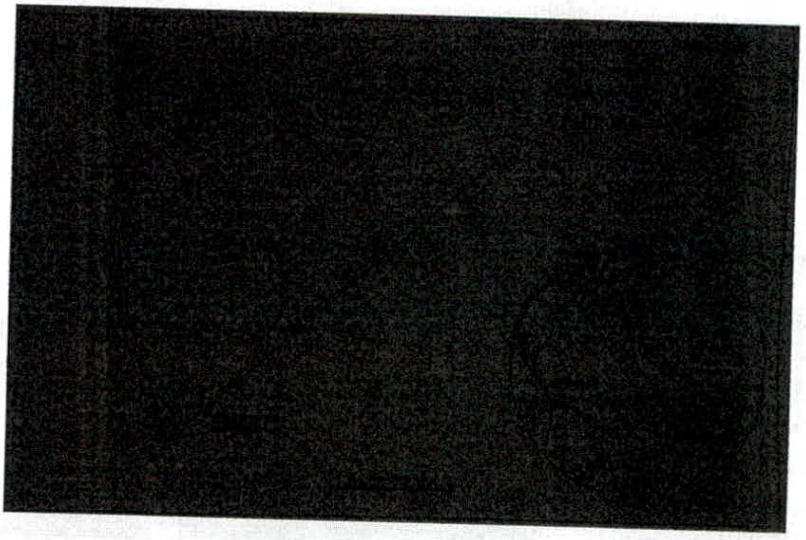

6.- Acopio de Materiales

En la ruta N°45 a la altura del km 73 se encuentra arrendado por la empresa un predio para el acopio de material granular.
Este cuenta con una nota de autorización por los propietarios para el uso de este tipo de almacenaje. Anexo III
El volumen extraído de material de cantera corresponde a 33044 metros cúbicos en el periodo de Mayo de 2017 a Julio de 2017.

6- Formularios y registros

Se presentan formularios y planillas de controles realizados en Obra.
Se adjunta un plan de acción para el levantamiento de observaciones, en el mismo se describen las observaciones ocurridas en Obra y su solución, así como también se describen las contingencias surgidas en la misma.

Anexo I

INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
OBRA: RUTA 45

INDICADOR	UNIDAD	2017		
		Mayo	Junio	Julio
Residuos domestico de obrador.	Kg/mes	53,60	53,60	53,60
Material sobrante de las excavaciones vertido en predios públicos o privados autorizados.	m^3/mes		1597,00	2353,00
Consumo de agua	m^3	30,00	40,00	35,00
	l/hht	0,02	0,01	0,01
Consumo de energía eléctrica	Kwh			
	Kwh/hht	256,00	1527,00	1556,00
Consumo de combustibles	l/mes	10824,00	46038,00	42506,00
	l/hht	5,98	8,63	8,81
Contaminación de suelo y agua	n° incidentes	0	0	0
Número de trabajadores	cantidad/mes	22,00	31,00	37,00
Horas hombre trabajadas	hht/mes	1810,00	5336,00	4827,00
Número de incidentes con lesión	n°/mes	0	0	0
Indice de frecuencia de incidentes con lesión (mensual)	n°/mill.hht.mes	0	0	0
Indice de frecuencia de incidentes con lesión (acumulado)	n°/millón hht	0	0	0
Número de quejas o denuncias	cantidad/mes	0	0	0
Afectación a servicios públicos	cantidad/mes	0	1	0
Afectación a la propiedad privada (muros, viviendas, etc.)	cantidad/mes	0	0	0
etc.)	cantidad/mes	0	0	0

Notas:
1 De afectacion a servicios Publicos
2 Generacion de Residuos domesticos
3 Vertido de material sobrante de las excavaciones

IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A.	PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	ITGA 1 Página 6 de 17

Anexo II

IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A.

FORMULARIO	F 10	Rev. 1
GESTIÓN DE ACEITE USADO	PÁGINA 1 DE 1	
	MEDIO AMBIENTE	

Volumen (litros)				Controlado por	Retirado por			Especificar cuál es el destino final o realización	Observaciones
Fecha	Operación		Acumulado	Nombre	Empresa	Nombre	Firma		
	Entrada	Salida							
22/5/17	25	25		H. Montes	Impacto Const	H. Montes		Taller	Retiro Reciclado Oil
8/6/17	25	25		H. Montes	Impacto Const	H. Montes		Taller	Retiro Reciclado Oil
8/6/17	25	25		H. Montes	Impacto Const	H. Montes		Taller	" "
23/6/17	12	12		H. Montes	Impacto Const	H. Montes		Taller	" "
23/6/17	23	23		H. Montes	Impacto Const	H. Montes		Taller	" "
12/7/17	28	28		H. Montes	Impacto Const	H. Montes		Taller	" "
14/7/17	23	23		H. Montes	Impacto Const	H. Montes		Taller	" "
26/7/17	28	28		H. Montes	Impacto Const	H. Montes		Taller	" "
28/7/17	12	12		H. Montes	Impacto Const	H. Montes		Taller	" "
TOTAL MES									

7/32

Anexo III

IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A.

San José, 28 de junio del 2017

Director de Obra Ing. Luis Rodríguez por el MTOP.

Presente

En carácter de propietaria Lorena Rodríguez CI 4.730.337-0 y en representación de Marcelo Chiappa con la C.I: 5.023.808-3, y a efectos del arrendamiento del predio Padrones 19.022 y 19217, ubicado en Ruta 45 Km 73, departamento de San José, autorizo por la presente a la empresa Impacto Construcciones S.A. a la utilización de dicho predio con el fin de acopio de materiales granulares y depósito de material sobrante de las obras LICITACION C/76- "Rehabilitación Ruta 45, Tramo: 54km400-69km400" y LICITACION C/72- "Rehabilitación Ruta 45, Tramo 69 Km 400-84 Km. 600"

Sin otro particular, Saluda Atentamente;

Firma: .....

Aclaración: Lorena Rodríguez

Carlos Mª. Ramírez 679 – Trinidad – Flores
Tel: 4364 8259 – Fax Int 34
oficinatecnica@impactoconstrucciones.com

LSOA CERTIFICADO CERTIFICATE · IQNet · qualityaustria SYSTEMS CERTIFIED

www.impactoconstrucciones.com

Bulevar España 2683 apto 502 - Montevideo
Teléfonos: 27093184 - Fax Int 103 - 27089102
oficinatecnicamontevideo@impactoconstrucciones.com

8/32

Notas de Análisis de agua de las casas

LABORATORIO CRISTAR ZERBI

Canelones 846 —Tel/Fax 2900 75 05
laboratorio@cristarzerbi.com.uy

ANALISIS DE AGUA

Fecha de informe: 06 de junio de 2017

Solicitante: IMPACTO CONSTRUCCIONES
Carlos María Ramírez 679
Trinidad - Flores

Recolección y entrega de muestra: por el interesado

Fecha de muestreo: 01/06/17 **Fecha de ingreso al laboratorio:** 02/06/17

Fecha de análisis: 02/06/17

RESULTADOS DE ANALISIS

Rótulo de la Muestra: Casa Villa Rodríguez **Código de laboratorio:** 99560

ANALISIS	RESULTADOS	UNIDADES	VALOR GUIA	TECNICA
coliformes totales	cero	ufc/100 ml	cero	9222 B
coliformes fecales	cero	ufc/100 ml	cero	9222 D
Pseudomona aeruginosa	cero	ufc/100 ml	cero	ISO 16266:06
total bacterias aerobias	cero	ufc/ml	500	9215 B

MARIANA FOLLE
Química Farmacéutica

TIMBRE PROFESIONAL
COLOCADO EN COPIA
según reglamento CJPPU

los resultados del ensayo se refieren exactamente a la muestra recibida
valor guía corresponde a los valores máximos admisibles de acuerdo a la norma UNIT 833:2008
las técnicas son basadas en el A.P.H.A. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22th Edition
este informe sólo podrá ser reproducido total o parcialmente previa autorización escrita del Laboratorio

Página 1de 1

LABORATORIO CRISTAR ZERBI

Canelones 846 —Tel/Fax 2900 75 05
laboratorio@cristarzerbi.com.uy

ANALISIS DE AGUA

Fecha de Informe: 06 de junio de 2017

Solicitante: IMPACTO CONSTRUCCIONES
Carlos María Ramírez 679
Trinidad - Flores

Recolección y entrega de muestra: por el interesado

Fecha de muestreo: 01/06/17 **Fecha de ingreso al laboratorio:** 02/06/17

Fecha de análisis: 02/06/17

RESULTADOS DE ANALISIS

Rótulo de la Muestra: Galareto **Código de laboratorio:** 99561

ANALISIS	RESULTADOS	UNIDADES	VALOR GUIA	TECNICA
coliformes totales	cero	ufc/100 ml	cero	9222 B
coliformes fecales	cero	ufc/100 ml	cero	9222 D
Pseudomona aeruginosa	cero	ufc/100 ml	cero	ISO 16266:06
total bacterias aerobias	cero	ufc/ml	500	9215 B

MARIANA FOLLE
Química Farmacéutica

TIMBRE PROFESIONAL
COLOCADO EN COPIA
según reglamento CJPPU

los resultados del ensayo se refieren exactamente a la muestra recibida
valor guía corresponde a los valores máximos admisibles de acuerdo a la norma UNIT 833:2008
las técnicas son basadas en el A.P.H.A. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22th Edition
este informe sólo podrá ser reproducido total o parcialmente previa autorización escrita del Laboratorio

Página 1de 1

LABORATORIO CRISTAR ZERBI

Canelones 846 —Tel/Fax 2900 75 05
laboratorio@cristarzerbi.com.uy

ANALISIS DE AGUA

Fecha de informe: 06 de junio de 2017

Solicitante: IMPACTO CONSTRUCCIONES
Carlos María Ramírez 679
Trinidad - Flores

Recolección y entrega de muestra: por el interesado

Fecha de muestreo: 01/06/17 **Fecha de ingreso al laboratorio:** 02/06/17

Fecha de análisis: 02/06/17

RESULTADOS DE ANALISIS

Rótulo de la Muestra: Cantera **Código de laboratorio:** 99562

ANALISIS	RESULTADOS	UNIDADES	VALOR GUIA	TECNICA
coliformes totales	cero	ufc/100 ml	cero	9222 B
coliformes fecales	cero	ufc/100 ml	cero	9222 D
Pseudomona aeruginosa	cero	ufc/100 ml	cero	ISO 16266:06
total bacterias aerobias	292	ufc/ml	500	9215 B

MARIANA POLLE
Química Farmacéutica

TIMBRE PROFESIONAL
COLOCADO EN COPIA
según reglamento CJPPU

los resultados del ensayo se refieren exactamente a la muestra recibida
valor guía corresponde a los valores máximos admisibles de acuerdo a la norma UNIT 833:2008
las técnicas son basadas en el A.P.H.A. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22th Edition
este informe sólo podrá ser reproducido total o parcialmente previa autorización escrita del Laboratorio

Página 1de 1

Habilitaciones para limpieza y desagote de baños químicos y casas.

A y C Químicos

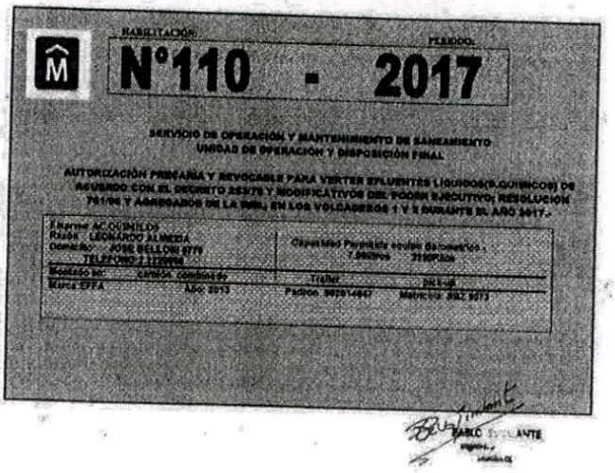

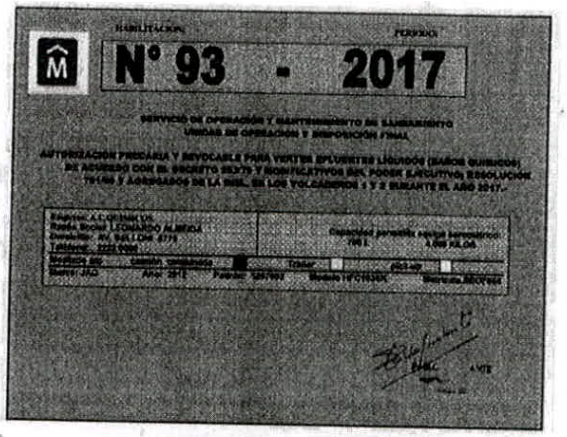

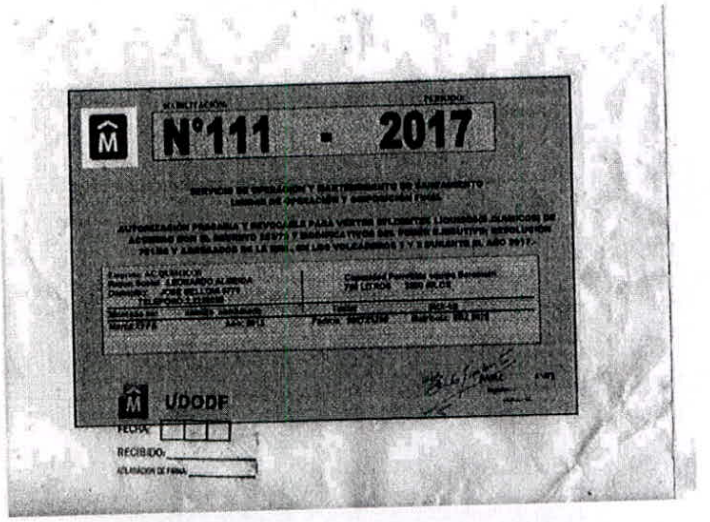
N°111 - 2017
UDODF
RECIBIDO:

Habilitación Sagasti

San José INTENDENCIA

77/4153/02

A.V Nº 072773

San José, 27 de diciembre de 2002.

RESOLUCIÓN Nº 1970/2002 **EXPEDIENTE Nº 4153/2002**

SE AUTORIZA AL SEÑOR WINSTON JOSE SAGASTI OVIEDO A PRESTAR EL SERVICIO DE BAROMÉTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PUNTAS DE VALDEZ, ECILDA PAULLIER, JUAN SOLER , RAFAEL PERAZA Y LIBERTAD

VISTO: la solicitud formulada por el señor Winston José SAGASTI OVIEDO relativa a continuar con la prestación del servicio de barométrica en las localidades de Puntas de Valdez, Ecilda Paullier, Juan Soler, Rafael Peraza y Libertad;

CONSIDERANDO: que el vehículo propuesto fue inspeccionado por el Departamento de Higiene, encontrándose en condiciones para el servicio;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente;

El Intendente de San José, RESUELVE:

1°.- Autorizase al señor Winston José SAGASTI OVIEDO a continuar con la prestación del servicio de barométrica en las localidades de Puntas de Valdez, Ecilda Paullier, Juan Soler, Rafael Peraza y Libertad, con el camión marca Mercedes Benz del año 1978, modelo L 1113/48, padrón Nº 37.846, matrícula Nº 201.129 de San José.-

2°.- La autorización otorgada reviste el carácter de precaria y revocable, debiendo cesar en el momento que la Intendencia lo determine.-

3°.- El citado servicio no podrá ser transferido a terceros.-

4°.- Cométese al Departamento de Higiene notificar la presente resolución al permisario, así como indicarle los lugares de descargas y que será necesaria la autorización de la Intendencia para la fijación de precios.-

5°.- Pase al Departamento de Hacienda para su conocimiento.-

IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A.	**PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL**	ITGA 1 Página 14 de 17

Control Registro de Energía y Agua

IMPACTO

FORMULARIO

Control de Consumo de Agua y Energía Eléctrica

Ver 1

Jun 1 de 1

MEDIO AMBIENTE

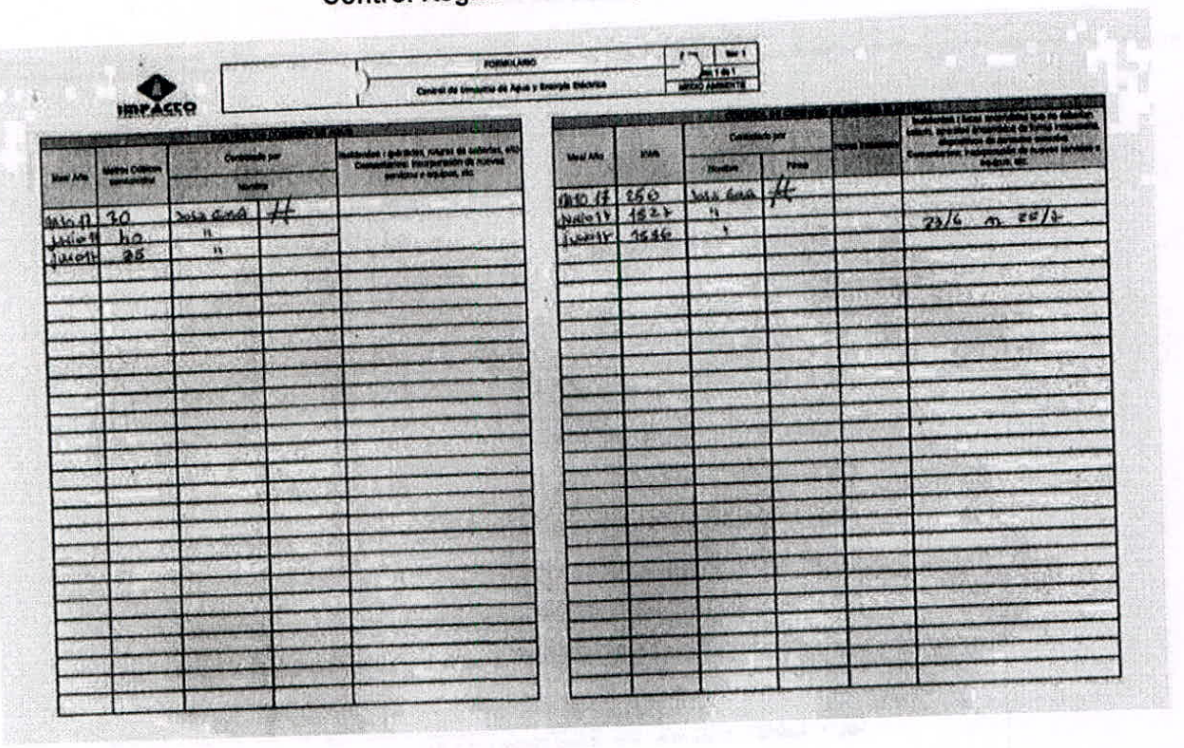

Mes/ Año	Metros Cúbicos consumidos	Controlado por Nombre		Incidentes (quiebres, roturas de cañerías, etc) Comentarios: Incorporación de nuevos servicios o equipos, etc.
Julio 17	30	Josa Gina	[illegible]	
Julio 17	40	"		
Julio 17	25	"		

Mes/ Año	KWh	Controlado por Nombre	Firma	Horas Trabajadas	Incidentes (fallas anormales que no deberían estarlo, aparatos inservibles de forma inesperada, dispositivos de servicios sensibles. Comentarios: Incorporación de nuevos servicios o equipos, etc.
Julio 17	250	Josa Gina	[illegible]		
Julio 17	1527	"			23/6 a 25/7
Julio 17	1536	"			

IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A.	**PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL**	ITGA 1 Página 15 de 17

Desechos de Mecánica

IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A.	FORMULARIO	F 14	Rev. 1
	Gestión de Trapos, Estopas, Filtros, Neumáticos usados, Pilas, Tubos de Luz, Aceite Comestible Usado y otros	Página 1 de 1	
		MEDIO AMBIENTE	

Fecha	Marque el que corresponda							Unidad (bolsas, lts, kgs, unidades)	Cantidad Entregada	Controlado por		Retirado por		
	Trapos	Estopas	Filtros	Neumáticos usados	Pilas	Tubos de Luz	Aceite Comestible Usado			Nombre	Empresa	Nombre	Firma	Destino Final
21/5/17	1	2												
8/6/17	1	2												
8/6/17	1	2												
13/6/17	1	2												
26/6/17	1	2												
10/7/17	1	2												
19/7/17	1	2												
26/7/17	1	2												
26/9/17	1	2												

IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A.	PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	ITGA 1 Página 16 de 17

Residuos de Plásticos y Papeles

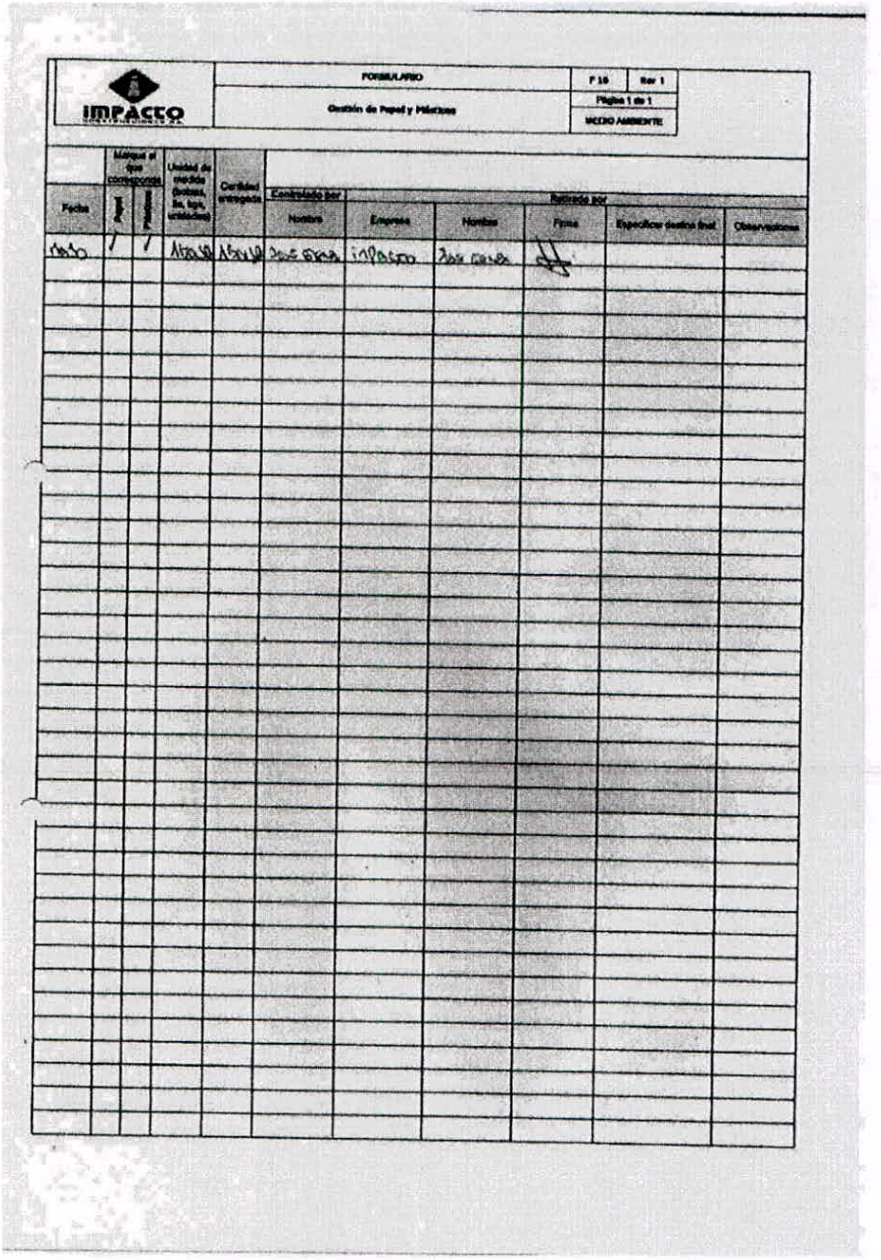

IMPACTO	FORMULARIO	F 16	Ser 1
	Gestión de Papel y Plásticos	Página 1 de 1	
		MEDIO AMBIENTE	

Fecha	Marque el que corresponda: Papel	Marque el que corresponda: Plásticos	Unidad de medida (bolsas, lts, kgs, unidades)	Cantidad entregada	Controlado por: Nombre	Controlado por: Empresa	Retirado por: Nombre	Retirado por: Firma	Retirado por: Especificar destino final	Observaciones
Mayo	/	/	1500 kg	1500 kg	José Serna	impacto	José Serna	[illegible]		

Carlos Mª. Ramírez 679 – **Trinidad – Flores**
Tel: 4364 8259 – Fax Int 34
oficinatecnica@impactoconstrucciones.com

LSQA CERTIFICADO CERTIFICATE · IQNet · qualityaustria SYSTEM CERTIFIED

www.impactoconstrucciones.com

Bulevar España 2683 apto 502 - **Montevideo**
Teléfonos: 27093184 - Fax Int 103 - 27089102
oficinatecnicamontevideo@impactoconstrucciones.com

17/32

IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A.	**PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL**	ITGA 1 Página 17 de 17

PLAN DE ACCIÓN
Para el levantamiento de Desviaciones

Nº	N° desviación asignado	FECHA DE DETECCIÓN	Área o sector	DESCRIPCIÓN DE LA DESVIACIÓN	ACCIONES INMEDIATAS (aquellas que están relacionadas con la evidencia de la desviación)	Plazo ejecución Acciones inmediatas	Responsable (opcional)	Estatus	Cierre final	FOTO DESVIACION (con fecha y referencia)	FOTO LEVANTAMIENTO DESVIACION (con fecha y referencia)
1	1 ACC/ SB	8-Jun-17	Ruta 45 km 79	En operacion de descargo de materiales arido para relleno de banquina una de las camiones de la empresa cuando mueve la zorra despues de la descarga engancha un tendido de cable de media, cortandole y tirando las columnas.	Distraccion del chofer y del personal guia en una zona de especial cuidado.	Se delimita la zona y se hizo la denuncia correspondiente a la UTE y a Berkley	Jose Gerez / Jose Gonzalez				
	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior		
	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior		
2	1 Inc/Amb	19-ago-17	Ruta 45 km 79	Se detecta obstruccion de caño de alcantarilla en zona de acopio.	Acopios sin proteccion y lluvia arastra los aridos	Se manda personal para limpieza	Jose Gerez / Jose Gonzalez		si		
	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior	Idem Anterior	

Ing. Gustavo Silvera

Impacto Construcciones

MTOP DNV	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fecha: 05/06/2017
		Pág. 1 de 6

LISTA DE CHEQUEO BÁSICA PARA INFORMES TRIMESTRALES – Mayo 2017 – Julio 2017
OBRA: Licitación Nº C/72: "Ruta 45 – tramo 69Km400 – 84Km500"
Nº C/76: "Ruta 45 – tramo 54Km400 – 69Km400" por IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A.

Campamento		SI	NO	COMENTARIOS
1	¿Se ha incluido un plano del campamento?	X		Camino de la Costa a 4km de Ruta 45
1.1	¿Hay baños fijos en el campamento?	X		1 baños
1.2	¿Hay depósito fijo (pozo negro) en el campamento?	X		1 pozo
1.3	¿Se han entregado los registros de las operaciones de limpieza del pozo?	X		Se encuentran en oficina. Se presentó resumen.
1.4	¿Hay baños químicos?	X		Próx. al puente
1.5	¿Se han entregado los registros de las operaciones de limpieza de los baños químicos?	X		Se encuentran en oficina. Se presentó resumen.
1.6	¿Hay baños portátiles?		x	-
1.7	¿Se han entregado los registros de las operaciones de limpieza de los baños portátiles?		x	No aplica
1.8	El agua de los grifos ¿es de la red de OSE?	X		
1.9	Si el agua de algún grifo no es de la red de OSE ¿se han entregado análisis químicos recientes de esa agua? Indicar fecha, laboratorio y parámetros analizados.	X		Se compra agua potable. Laboratorio Cristar Zerbi. Adjunto
Residuos sólidos domésticos		**SI**	**NO**	**COMENTARIOS**
2	¿Están ubicados en el plano los puntos de generación y recolección in situ de residuos domésticos?		x	
2.1	¿Hay puntos de acopio transitorio de residuos domésticos?	x		Tres contenedores.
2.2	¿Están ubicados en un plano los puntos de acopio transitorio de residuos domésticos?		x	
2.3	¿Cuál es el destino final de los residuos domésticos?			Vertedero Municipal
2.4	¿Se han entregado los registros de las operaciones de retiro y destino final de los residuos domésticos?		x	Se encuentran en oficina. Se presentó resumen adjunto.
2.5	Si los residuos domésticos se disponen en el predio ¿está indicado en el plano el lugar donde se entierran?		X	No aplica.
2.6	Si los residuos domésticos se disponen en el predio ¿se han entregado los registros de las operaciones de disposición y cubierta de los residuos?		X	No aplica.
Residuos especiales		**SI**	**NO**	**COMENTARIOS**
3	¿Están ubicados en el plano los puntos de generación de los diferentes tipos de residuos especiales?		x	

19/32

MTOP DNV	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fecha: 05/06/2017
		Pág. 2 de 6

LISTA DE CHEQUEO BÁSICA PARA INFORMES TRIMESTRALES – Mayo 2017 – Julio 2017
OBRA: Licitación Nº C/72: "Ruta 45 – tramo 69Km400 – 84Km500"
Nº C/76: "Ruta 45 – tramo 54Km400 – 69Km400" por IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A.

3.1	¿Está previsto clasificar y gestionar por separado los diferentes tipos de residuos especiales? Indicar tipos previstos. (Chatarra, hierro, madera, residuos de demolición, descartes de asfalto, baterías, material contaminado con hidrocarburos, filtros, aceites y lubricantes usados, etc.)	x		Aceites, filtros y envases para mantenimiento de equipos.
3.2	¿Hay puntos de acopio transitorio de los diferentes tipos de residuos especiales?	x		Taller Mecánico Móvil.
3.3	¿Están ubicados en el plano los puntos de acopio transitorio de cada uno de los diferentes tipos de residuos especiales?		x	
3.4	¿Se han entregado los registros de las operaciones de retiro y destino final de cada uno de los tipos de residuos especiales?		x	Se encuentran en oficina.
Mantenimiento y lavado de maquinaria		**SÍ**	**NO**	**COMENTARIOS**
4	¿Cómo se compone actualmente la flota de maquinaria vinculada a la obra?	x		Camiones Volcadores, Retro, Pata de Cabra y Motoniveladora.
4.1	¿Se han entregado los registros de realización de mantenimiento preventivo de maquinaria?		x	Se encuentran en oficina. Se presentó resumen.
4.2	¿Se han entregado los registros de las operaciones de abastecimiento de combustible a la maquinaria?		x	Se encuentran en oficina. Se presentó resumen.
4.3	¿Se han entregado los registros de las operaciones de cambio de aceite a la maquinaria?		x	Se encuentran en oficina. Se presentó resumen.
4.4	¿Se han entregado los registros de las operaciones de lavado de la maquinaria?			No aplica
4.5	¿Hay algún sistema de retención de sólidos, grasas, etc. previo al vertido del agua de lavado de maquinaria? Describir.			Taller Central
4.6	¿Se han entregado los registros de la operación y/o mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas de lavado de maquinaria?			No aplica
Hormigones		**SÍ**	**NO**	**COMENTARIOS**
5	¿Se requiere en la obra la colocación de hormigón?	x		
5.1	El hormigón ¿se adquiere a un proveedor comercial? Indicar firma comercial, domicilio y RUC del proveedor	x		Hormigones Uruguay Montevideo, Camino Oncativo 3186.
5.2	¿Se fabrica hormigón en obra?		x	
5.3	¿Está indicado en el plano el lugar donde se lavan las herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón?		x	

20/32

MTOP DNV	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fecha: 05/06/2017
		Pág. 3 de 6

LISTA DE CHEQUEO BÁSICA PARA INFORMES TRIMESTRALES – Mayo 2017 – Julio 2017
OBRA: Licitación Nº C/72: "Ruta 45 – tramo 69Km400 – 84Km500"
Nº C/76: "Ruta 45 – tramo 54Km400 – 69Km400" por IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A.

5.4	¿Hay algún sistema de retención de sólidos, corrección de pH, etc. previo al vertido del agua de lavado de las herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón?. Describir.		x	
5.5	¿Se han entregado los registros de la operación y/o mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas de lavado de herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón?			No aplica.
5.6	¿Se han entregado los registros de control de pH de las aguas de lavado previo a su vertido?		x	
Canteras		**SI**	**NO**	**COMENTARIOS**
6	¿Se requiere tosca para la obra?	X		
6.1	¿Se explotan canteras de tosca en la obra?	X		
6.2	Si se requiere tosca pero no se explotan canteras, indicar quién es el proveedor comercial (firma comercial, domicilio y RUC)			No aplica.
6.3	Las canteras de tosca, ¿están incluidas en el Inventario de Canteras de Obra Pública?.	X		
6.4	¿Se adjunta copia de la Comunicación ante DINAMA de las canteras de tosca vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?	x		Adjunto.
6.5	¿Se adjunta copia de los Certificados de Clasificación de las canteras de tosca vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?	x		Adjunto.
6.6	¿Se adjunta copia de la Resolución Ministerial de las AAP de las canteras de tosca vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?	x		Adjunto.
6.7	¿Se requiere arcilla para la obra?		X	
6.8	Si se requiere arcilla pero no se explotan canteras, indicar quién es el proveedor comercial (firma comercial, domicilio y RUC)			No aplica.
6.9	¿Se explotan canteras de arcilla en la obra?		X	
6.10	Las canteras de arcilla, ¿están incluidas en el Inventario de Canteras de Obra Pública?			No aplica.
6.11	¿Se adjunta copia de la Comunicación ante DINAMA de las canteras de arcilla vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?			No aplica.
6.12	¿Se adjunta copia de los Certificados de Clasificación de las canteras de arcilla vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?			No aplica.
6.13	¿Se adjunta copia de la Resolución Ministerial de las AAP de las canteras de arcilla vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?			No aplica
6.14	¿Se requiere limo para la obra?		x	
6.15	¿Se explotan canteras de limo en la obra?			No aplica.
6.16	Si se requiere limo pero no se explotan canteras de limo, indicar quién es el proveedor comercial (firma comercial, domicilio y RUC)			No aplica.
6.17	Las canteras de limo, ¿están incluidas en el Inventario de Canteras de Obra Pública?			No aplica.
6.18	¿Se adjunta copia de la Comunicación ante DINAMA de las canteras de limo vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?			No aplica.
6.19	¿Se adjunta copia de los Certificados de Clasificación de las canteras de limo vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?			No aplica.
6.20	¿Se adjunta copia de la Resolución Ministerial de las AAP de las canteras de limo vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?			No aplica.

21/32

MTOP DNV	INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fecha: 05/06/2017
		Pág. 4 de 6

LISTA DE CHEQUEO BÁSICA PARA INFORMES TRIMESTRALES – Mayo 2017 – Julio 2017
OBRA: Licitación Nº C/72: "Ruta 45 – tramo 69Km400 – 84Km500"
Nº C/76: "Ruta 45 – tramo 54Km400 – 69Km400" por IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A.

6.21	¿Se requiere arena para la obra?		x	
6.22	Las canteras de arena, ¿están incluidas en el Inventario de Canteras de Obra Pública?			No aplica.
6.22	Si se requiere arena pero no se explotan canteras de arena, indicar quién es el proveedor comercial (firma comercial, domicilio y RUC)			No aplica.
6.23	¿Se explotan canteras de arena en la obra?			No aplica.
6.24	¿Se adjunta copia de la Comunicación ante DINAMA de las canteras de arena vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?			No aplica.
6.25	¿Se adjunta copia de los Certificados de Clasificación de las canteras de arena vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?			No aplica.
6.26	¿Se adjunta copia de la Resolución Ministerial de las AAP de las canteras de arena vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?			No aplica.
6.27	¿Se requieren agregados pétreos para la realización de la obra?	x		
6.28	¿Se explotan canteras de piedra en la obra?		x	
6.29	Si se requieren áridos pero no se explotan canteras de piedra, indicar quién es el proveedor comercial (firma comercial, domicilio y RUC)			Canteras Montevideo S.A. Camino Pavia 3112
6.30	Las canteras de piedra, ¿están incluidas en el Inventario de Canteras de Obra Pública?			No aplica.
6.31	¿Se adjunta copia de la Comunicación ante DINAMA de las canteras de piedra vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?			No aplica.
6.32	¿Se adjunta copia de los Certificados de Clasificación de las canteras de piedra vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?			No aplica.
6.33	¿Se adjunta copia de la Resolución Ministerial de las AAP de las canteras de piedra vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?			No aplica.
Planta de trituración de áridos		**SI**	**NO**	**COMENTARIOS**
7	¿Se requieren áridos para la obra?		x	
7.1	Para la ejecución de la obra ¿se operará una planta de trituración de áridos?			No aplica.
7.2	Si se requieren áridos pero no se explota una planta de trituración, indicar quién es el proveedor comercial (firma comercial, domicilio y RUC)			No aplica.
7.3	¿Se ha entregado un plano que muestre la ubicación de la planta de trituración de áridos, los caminos de acceso a emplear, los usos de los padrones adyacentes y la vivienda habitada más próxima?			No aplica.
7.4	¿Qué medidas se toman en la planta de trituración para reducir las emisiones de polvo?			No aplica.
7.5	¿Se han entregado los registros que documentan la implementación de las medidas tomadas para reducir las emisiones de polvo en la planta de trituración?			No aplica.
Planta asfáltica		**SI**	**NO**	**COMENTARIOS**
8	Para la ejecución de la obra ¿se operará una planta asfáltica?		X	
8.1	¿Se ha entregado un plano que muestre la ubicación de la planta asfáltica, los caminos de acceso a emplear, los usos de los padrones adyacentes y la vivienda habitada más próxima?			No aplica.
8.2	¿Qué sistema tiene la planta asfáltica para reducir las emisiones			No aplica.

22/32

LISTA DE CHEQUEO BÁSICA PARA INFORMES TRIMESTRALES – Mayo 2017 – Julio 2017
OBRA: Licitación Nº C/72: "Ruta 45 – tramo 69Km400 – 84Km500"
Nº C/76: "Ruta 45 – tramo 54Km400 – 69Km400" por IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A.

	de polvo?			
8.3	¿Se han entregado los registros de operación y/o mantenimiento del sistema de control de emisiones a la atmósfera de la planta asfáltica?			No aplica.
8.4	¿Se han entregado los registros de las operaciones de descarga de asfalto?			No aplica.
8.5	¿Se han entregado los registros de las operaciones de limpieza de pequeños derrames y disposición de los residuos resultantes?			No aplica.
Camiones y fleteros		**SI**	**NO**	**COMENTARIOS**
9	¿Cuántos camiones se vinculan a la realización de la obra en el período que se informa?			Camión Mixer y Camión de transporte de tosca. 20 aprox.
9.1	Indicar matrícula y relación con la empresa de cada uno de los camiones vinculados a la obra en el período que se informa.			
9.2	¿Se ha entregado copia de los certificados del SUCTA de todos los camiones vinculados a la obra para el período que se informa?		x	En camión y Oficina.
9.3	¿Hay algún vehículo que tenga observaciones en el capítulo 8 del certificado del SUCTA? Indicar matrícula y observaciones.		x	
9.4	¿Se cubre la caja de los camiones que transportan materiales (indicar cuáles)? ¿Con qué?		x	
Monitoreo de variables ambientales		**SI**	**NO**	**COMENTARIOS**
10	¿Hay tareas de muestreo de calidad de aguas previstas?	x		
10.1	¿Se han entregado los resultados de los análisis previstos para el período que se informa? Detallar fecha de toma de muestras, laboratorio actuante, puntos de toma de muestra y parámetros analizados.			Adjunto. Laboratorio Cristar Zerbi Adjunto.
10.2	¿Hay tareas de medición de niveles de ruido previstas?		x	
10.3	¿Se han entregado los resultados de las mediciones previstas para el período que se informa? Detallar fecha de los estudios, técnico actuante, parámetros relevados, puntos de medición y resultados obtenidos.			No aplica.
10.4	¿Hay otras tareas de muestreo de variables ambientales previstas?		x	
10.5	¿Se han entregado los resultados de las mediciones previstas para el período que se informa? Detallar fecha de los estudios, técnico actuante, parámetros relevados, puntos de medición y resultados obtenidos.			No aplica.
Personal		**SI**	**NO**	**COMENTARIOS**
10.6	¿Cuántas personas trabajan actualmente en la obra?			Promedio 20 personas.
10.7	¿Cuántas de las personas que trabajan actualmente en la obra han sido contratadas para esta obra en el área de influencia directa de la misma?			4 Persona.
Relacionamiento con la comunidad		**SI**	**NO**	**COMENTARIOS**
10.8	¿Se han emitido comunicados por desvíos de tránsito o seguridad vial motivados por el funcionamiento de la obra?		x	Sólo cortes momentáneos.

23/32

LISTA DE CHEQUEO BÁSICA PARA INFORMES TRIMESTRALES – Mayo 2017 – Julio 2017
OBRA: Licitación Nº C/72: "Ruta 45 – tramo 69Km400 – 84Km500"
Nº C/76: "Ruta 45 – tramo 54Km400 – 69Km400" por IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A.

	Detallar.			
10.9	¿Se han recibido quejas u observaciones por parte de los vecinos o las autoridades locales motivados por la existencia o el funcionamiento de la obra? Detallar.		x	
Registros fotográficos		**SI**	**NO**	**COMENTARIOS**
11	¿Se han entregado registros fotográficos de la evolución de los diferentes frentes de obra y zonas del campamento para el período que se informa?	x		

MTOP DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA

3972

2017-10-3-0001297
DCC

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 31 JUL 2017

VISTO: estos antecedentes relacionados con el yacimiento de tosca, ubicado en el padrón N°2.802 (parte), de la 7ma. Sección Judicial y Catastral del Departamento de San José.----------

RESULTANDO: I) Que la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estima necesario la inclusión de dicho yacimiento en el Inventario de Canteras de Obras Públicas a que refiere el artículo 250 de la Ley N°16.320 de fecha 1° de noviembre de 1992, cuyo material será utilizado en las obras denominadas: "Ruta N°45 – Rehabilitación tramo Km 69,400 - 84,500" y "Ruta N°45 – Rehabilitación tramo Km 54,400 - 69,400", a cargo de la empresa IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A., en el marco de las Licitaciones C/72 y C/76, contratadas por la Corporación Vial del Uruguay S.A.----------

II) Que el Área Servicios Jurídicos (Departamento Asesoría Letrada) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al tomar intervención, manifiesta que no existen impedimentos de índole jurídico para acceder a lo solicitado, gestión que se ajusta a la preceptiva contenida en el artículo 250 de la Ley N°16.320 de fecha 1° de noviembre de 1992.----------

III) Que asimismo, el interesado deberá obtener y acreditar las autorizaciones ambientales pertinentes de parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, conforme a lo establecido en el Decreto N°349/005 de fecha 21 de setiembre de 2005.----------

25 | 32

CONSIDERANDO: que las canteras incluidas en el referido Inventario no están regidas por las disposiciones del Código de Minería y rigen por consiguiente las normas de derecho común aplicables en la materia.----------

ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley N°16.320 de fecha 1° de noviembre de 1992.----------

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

R E S U E L V E:

1°.- Inclúyase en el Inventario de Canteras de Obras Públicas, a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el yacimiento de tosca, ubicado en el padrón N°2.802 (parte), de la 7ma. Sección Judicial y Catastral del Departamento de San José, propiedad del Sr. Ramón Eduardo Curbelo Camacho.----------

2°.- Autorízase asimismo la extracción de 72.000 m^3 del material correspondiente, en un área de explotación de 7hás., para su utilización en la ejecución de las obras denominadas: "Ruta N°45 – Rehabilitación tramo Km 69,400 - 84,500" y "Ruta N°45 – Rehabilitación tramo Km 54,400 - 69,400", a cargo de la empresa IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A., en el marco de las Licitaciones C/72 y C/76, contratadas por la Corporación Vial del Uruguay S.A.----------

3°.- Establécese que previamente a la extracción que se autoriza, la citada empresa, deberá presentar ante la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la correspondiente autorización ambiental emitida por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N°349/005 de fecha 21 de setiembre de 2005.----------

DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA

4°.- Comuníquese, publíquese y vuelva a la mencionada Dirección Nacional, para notificación del interesado y demás efectos.----------

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ
Presidente de la República
Período 2015 - 2020

27|32

DIRECCION NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN

MVOTMA Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente | DINAMA Dirección Nacional de Medio Ambiente

CARATULA DE NOTIFICACIONES

TITULAR DEL TRÁMITE	**IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A.**
ASUNTO	**CONVALIDACIÓN,AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PREVIA Y DE OPERACIÓN ,MULTA**

NOTIFICAR A	**Nº TEL/FAX/E-MAIL**
IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A.	2709 3184 4364 8259 INT 103
DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA	**acuerdos@mvotma.gub.uy**
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	**tesoreriadgs@mvotma.gub.uy**

REFERENCIA	
	Notificación Resolución DINAMA Nº
*	**Notificación Resolución Ministerial Nº 1162/2017**
	Otorgamiento de Vista (art.75 Decreto 500/991)
	Notificación Certificado de Proyecto
	Otro:
Nº trámite	**2017/14000/06237**

Nº páginas: 5	**Fecha : 10/08/2017**

CONFIRMACIÓN DE ENVIO DE NOTIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: MICAELA GIMÉNEZ	**NOTIFICADO POR: MICAELA GIMÉNEZ**

TEL: 2917 07 10 int. 5607/3055 FAX: 4511
FO-DA-29-07

28/32

59

MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

Expte.2017/06237

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

R.M. 1162/2017 Montevideo, 07 AGO 2017

VISTO: la comunicación realizada por IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A., respecto de su proyecto de extracción de tosca y balasto, ubicado en el padrón Nº 2.802, de la 7ª Sección Catastral, departamento de San José (Exp. 2017/14000/06237);

RESULTANDO: I) que dicha comunicación fue realizada con fecha 2 de mayo de 2017, proponiendo la clasificación del proyecto en la categoría "A", prevista en el literal "a" del artículo 5º del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales (aprobado por Decreto 349/005, de 21 de setiembre de 2005);

II) que a raíz de una denuncia realizada el 9 de mayo de 2017, personal del Área de Control y Desempeño Ambiental, el 23 de mayo de 2017, realizó en una inspección en las instalaciones de la interesada, constatando lo denunciado, esto es, la ejecución y operación de dicho proyecto sin contar con las autorizaciones ambientales correspondientes;

III) que como consecuencia de lo anterior por informes de la División Evaluación de Impacto Ambiental, de 26 de mayo se confirió vista a la interesada, por el término de 10 días hábiles (artículo 76 del Decreto N° 500/991 del 27 de setiembre de 1991), por cuanto se encontraba pasible de sanción con una multa de 200 UR (Unidades Reajustables, doscientas), por haber operado sin contar con las autorizaciones ambientales pertinentes;

IV) que evacuada la vista, la División Evaluación de Impacto Ambiental, por informe de 14 de junio de 2017 y la Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, por

29/32

informe de 28 de junio 2017, comparten que no son recibo los descargos presentados por la interesada, por cuanto los permisos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, son autorizaciones independientes con las autorizaciones que son competencia del presente Ministerio, por ende sugieren mantener el monto de dicho multa de 200 UR ;

V) asimismo el informe de la División Evaluación de Impacto Ambiental, por informe de 14 de junio de 2017, convalidar las actividades ya realizadas, así como otorgar la Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación para el resto de la ejecución del proyecto referido;

CONSIDERANDO: I) que la Dirección Nacional de Medio Ambiente sugiere proceder según lo indicado por la División Evaluación de Impacto Ambiental, convalidando las actividades ya realizadas, así como otorgar Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación para el resto de la ejecución del proyecto referido;

II) que la Dirección Nacional de Medio Ambiente sugiere proceder según lo indicado por la División Evaluación de Impacto Ambiental, aplicando a IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A., una sanción de 200 U.R, por estar operando su proyecto sin haber solicitado Autorización Ambiental de Operación, según lo dispuesto con dispuesto en el literal b) del artículo 29, y 30 del Decreto Nº 349/005, de 21 de setiembre;

ATENTO: a lo dispuesto en la Ley Nº 16.466 de 19 de enero de 1994 y el Decreto Nº 349/005 de 21 de setiembre de 2005;

LA MINISTRA DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

RESUELVE:

1º.- Convalídase las actividades realizadas por IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A. (RUT 214695220015) y otórgase

30/32

60

MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación respecto de su proyecto de extracción de tosca y balasto, ubicado en el padrón Nº 2.802, de la 7ª Sección Catastral, departamento de San José.-

2º.- La autorización referida en el ordinal anterior se concede sujeta al estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de la tramitación de la presente resolución y de las siguientes condiciones:

a) Toda modificación significativa al proyecto deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de Medio Ambiente para su análisis y aprobación.

b) Toda vez que se requiera realizar trasiego de combustibles, lubricantes y líquidos hidráulicos en el área de trabajo, se deberán colocar mantas absorbentes de hidrocarburos debajo del sitio cubriendo la superficie del suelo del sitio de operación.

c) Se deberá presentar a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, para su aprobación, dentro de 2 (dos) meses siguientes de finalizadas las obras, un informe de cierre del trabajo desarrollado, el que deberá contar con fotografías obtenidas desde sitios georreferenciados, que muestren la situación previa al inicio de la actividad, durante la actividad y posterior al abandono.-

3º.- La Autorización Ambiental de Operación tendrá vigencia hasta el 15 de mayo de 2018 y para un volumen máximo a extraer de 72.000 m^3 (setenta y dos mil metros cúbicos) de material granular medidos en banco. Prevéngase a la interesada que la presente autorización no admite prórroga del plazo señalado, ni ampliación del proyecto presentado. Actividades posteriores o por un volumen mayor, requerirán nueva autorización.-

31|32

4º.- Aplícase a IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A. (RUT 214695220015), una multa por un monto equivalente a 200 UR (Unidades Reajustables, doscientas), por haber operado sin contar con la correspondiente autorización ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 29 y artículo 30 del Decreto Nº 349/005, de 21 de setiembre de 2005.-

5º.- Intímase a la interesada, el pago de la suma indicada, la que deberá ser depositada dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente Resolución, en la Tesorería del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Zabala 1432, 1º piso, de la ciudad de Montevideo).-

[illegible] estipulado, remítase a la División Jurídica de la Dirección General de Secretaría a fin de proceder al cobro de la multa por la vía correspondiente.-

7º.- Esta resolución se dicta en cumplimiento de las normas en que se funda, por lo que es sin perjuicio de permisos o autorizaciones que correspondan a otros organismos públicos y de los derechos de terceros que pudieran corresponder.-

8º.- Pase a la Dirección Nacional de Medio Ambiente para proceder a la notificación de la interesada. Cumplido, desé cuenta a la Dirección General de Secretaría, a los efectos de la remisión de copia de la presente a la Intendencia de San José y a la Dirección Nacional de Minería y Geología del Ministerio de Industria, Energía y Minería.-

Arq. Eneida de León
Ministra de Vivienda,
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

32/32

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2017-10-3-0003629
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403
Fecha:	19/09/2017 10:14:10
Tipo:	Agregar Documentación

Se adjunta el informe trimestral de gestión ambiental de la empresa Impacto Construcciones S.A.Escaneadas (32 hojas)

Siga la prosecución del trámite.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2017-10-3-0003629-c 72.pdf	Sí
2	2017-10-3-0003629-c 72 1.pdf	Sí

Firmante:
FERNANDEZ FILIPPA,CARLOS

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2017-10-3-0003629
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100
Fecha:	19/09/2017 11:26:10
Tipo:	Enviar

Habiendo tomado conocimiento siga a la Unidad Ambiental - Ing. Ricardo Bértola a sus efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOP	EXPEDIENTE Nº
	2017-10-3-0003629
Oficina Actuante:	DNV - INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 10/003/10011021
Fecha:	21/09/2017 10:30:14
Tipo:	Enviar

Se ha recibido Informe Trimestral de Gestión Ambiental de la obra ¨LICITACIÓN Nº C/72 RUTA 45-TRAMO69K400-84K500¨ ¨LICITACIÓN Nº C/76 ¨RUTA 45-TRAMO54K400-69K400¨del que se toma conocimiento y habiendo sido agregado a la carpeta de la obra se remite a los efectos de su envío a la UCAT con destino a la CVU

Firmante:
BERTOLA GIGLIO, RICARDO

MTOP	EXPEDIENTE Nº
	2017-10-3-0003629
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000
Fecha:	22/09/2017 17:54:52
Tipo:	Enviar

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA
