

## AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 26 de julio de 2018, POR UNA PARTE: El Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante). POR OTRA PARTE: EDUARDO MARTINEZ S.A. (en adelante "el contratista"), representada en este acto por el Sr. Eduardo Martinez, titular de la cédula de identidad número 1.418.376-5, constituyendo domicilio en Bulevar Artigas 1659 escritorio 301 de esta ciudad, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

### PRIMERO – ANTECEDENTES:

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación (M/66) para la ejecución de la obra "Mantenimiento de la Ruta 15, tramo 165km – 195km", habiéndose recibido las ofertas el día 13/12/2016.; II) Por resolución del Directorio del día 22 de febrero de 2017, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa Eduardo Martínez SA y se suscribió contrato a estos efectos el día 26 de abril 2017.
- II) Por expediente N° 5152/2017 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato de acuerdo con lo previsto en el objeto del presente contrato.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 15 de junio de 2018 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A., resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente.

### SEGUNDO – OBJETO:

Por el presente, las partes acuerdan realizar una Ampliación de Contrato, para continuar con los trabajos de "***Escarificado, bacheos y tratamiento bituminoso en la ruta 15 entre las progresivas 165km y 195km***" de acuerdo con los rubros y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte de este contrato.

### TERCERO – PRECIO:

El monto básico del presente contrato de ampliación (sin impuestos ni leyes sociales) es de **\$U 10:323.169,85 (pesos uruguayos diez millones trescientos veintitrés mil ciento sesenta y nueve con 85/100)**, de acuerdo con lo previsto en el Anexo I, que se agrega y forma parte del presente contrato.

### CUARTO – MONTO IMPONIBLE:

El monto imponible a aumentar a precios básicos es de **\$ 1:463.193,55 (pesos uruguayos un millón cuatrocientos sesenta y tres mil ciento noventa y tres con 55/100)**.

### QUINTO – PLAZO:

Se amplía en 4 (cuatro) meses el plazo contractual vigente de acuerdo con el PDT y PFF que se agrega y forma parte del contrato (Anexo II).

### SEXTO – GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante seguro de fianza del Banco de Seguros del Estado, póliza N° 6055477/0 por un monto de U\$\$ 18.000 (dólares estadounidenses dieciocho mil).

**SEPTIMO – PREVISIONES VARIAS:**

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el contrato de fecha 26 de abril de 2017 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

**OCTAVO – DOMICILIOS:**

Las partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como respectivamente suyos en la comparecencia.

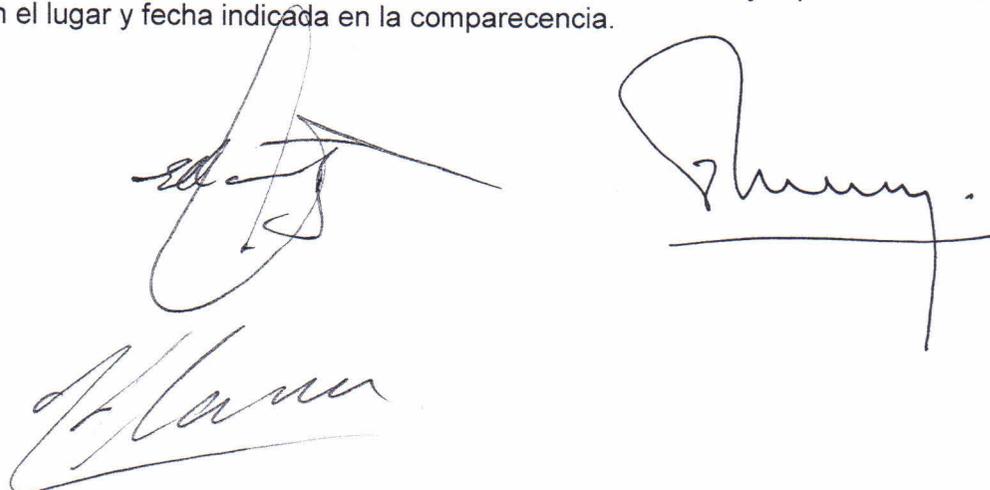
**NOVENO – COMPETENCIA Y JURISDECCIÓN APLICABLE:**

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.

**VIGESIMO – NO OBJECCIÓN DEL CONCEDENTE:**

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.

Three handwritten signatures in black ink are present on the page. The top-left signature is a stylized, cursive script. The top-right signature is a more fluid, cursive script. The bottom-left signature is a cursive script that appears to read 'L. Lauer'.

# ANEXO I



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY - EDUARDO MARTÍNEZ S.A.**

**Licitacion M/66 Ampliacion "Mantenimiento de la Ruta No. 15, tramo 165km000 - 195km000"**

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	METRAJE	PU sin impuestos \$	IMPORTE \$
I	1	MOVILIZACION	Global	1,00	331.408,35	331.408,35
II	25	ESCARIFICADO CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE	M2	18.000,00	52,00	936.000,00
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	Global	1,00	331.408,35	331.408,35
II	63	LIMPIEZA DE CANALES	ML	16.000,00	60,00	960.000,00
VI	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	28.890,00	16,00	462.240,00
VI	112	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE	M2	28.890,00	29,00	837.810,00
VII	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)	M3	4.500,00	680,00	3.060.000,00
IX	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	M3	346,68	1.950,00	676.026,00
XVII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	Global	1,00	54.314,15	54.314,15
LXXX	912	ALIMENTACION	Pers.Mes	10,00	37.000,00	370.000,00
LXXXII	915a	AUTOMOVIL SIN CHOFER	Veh.Mes	5,00	80.000,00	400.000,00
CLIV	2.138	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA MODIFICADA	M3	40,45	28.000,00	1.132.600,00
CLIII	2.136	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	M3	28,89	26.700,00	771.363,00
						<b>10.323.169,85</b>

# ANEXO II



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY - EDUARDO MARTÍNEZ S.A.

Licitación M/66 Ampliación "Mantenimiento de la Ruta No. 15, tramo 165km000 - 195km000"

FLUJO DE FONDOS EN \$ DEL MES 1 AL 4

RUBRO	DENOMINACION	METRAJE	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
1	MOVILIZACION	1	165.704	-	165.704	-
25	ESCARIFICADO CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE	18.000	93.600	280.800	280.800	280.800
71	RECUPERACION AMBIENTAL	1	49.711	49.711	66.282	165.704
63	LIMPIEZA DE CANALES	16.000	288.000	288.000	192.000	192.000
111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	28.890	-	138.672	138.672	184.896
112	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE	28.890	-	251.343	251.343	335.124
135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)	4.500	612.000	918.000	918.000	612.000
211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	347	-	202.808	202.808	270.410
382	SEÑALIZACION DE OBRA	1	13.579	13.579	13.579	13.579
912	ALIMENTACION	10	92.500	92.500	92.500	92.500
915a	AUTOMOVIL SIN CHOFER	5	100.000	100.000	100.000	100.000
2138	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA MODIFICADA	40	-	339.780	339.780	453.040
2136	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	29	-	231.409	231.409	308.545
			1.415.094	2.906.601	2.992.876	3.008.598
						10.323.170

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY - EDUARDO MARTÍNEZ S.A.  
 Licitación M/66 Ampliación "Mantenimiento de la Ruta No. 15, tramo  
 165km000 - 195km000"

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN % DEL MES 1 AL 4

RUBRO	DENOMINACION	METRAJE	MES					
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4		
1	MOVILIZACION	1	50	0	0	50	0	100
25	ESCARIFICADO CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE	18.000	10	30	30	30	30	100
71	RECUPERACION AMBIENTAL	1	15	15	20	20	50	100
63	LIMPIEZA DE CANALES	16.000	30	30	20	20	20	100
111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	28.890	0	30	30	30	40	100
112	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE	28.890	0	30	30	30	40	100
135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)	4.500	20	30	30	30	20	100
211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	347	0	30	30	30	40	100
382	SEÑALIZACION DE OBRA	1	25	25	25	25	25	100
912	ALIMENTACION	10	25	25	25	25	25	100
915a	AUTOMOVIL SIN CHOFER	5	25	25	25	25	25	100
2138	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA MODIFICADA	40	0	30	30	30	40	100
2136	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	29	0	30	30	30	40	100
